

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 01**

INÍCIO DA OBRA:	20/04/2023	MUNICÍPIO/UF:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	ADITIVO DE VALOR:	R\$	% ADITADO	0,00%	SALDO			
TERMINO PREVISTO:	17/10/2023	PROPOSTA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:	R\$	% SUPRIMIDO	0,00%	SALDO			
PRazo DE EXECUÇÃO:	180 DIAS	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 008/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO	R\$	% TOTAL	0,00%	SALDO			
DATA DE EMISSÃO BM:	05/06/2023	PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA DAS PAPOULAS E A TRAVESSA SEVERINO PEDRO MARCOLINO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.											
PERÍODO BM:	20/04/2023	ENDERECO:	SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	MEDICAO NO PERÍODO:	R\$	% ACUMULADO		% DESTE BM		PREVISTO			
SINAPI PE 08/2022 ONERADA, SICRO 04/2022 ONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS ONERADA		EMPREENHIMENTO:	Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)	BDI	20,05%	QUANTITATIVO		FINANCEIRO		MEDICAO NO PERÍODO			
ITEM	FONTES	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITARIO	PREVISTO	MEDICAO NO PERÍODO	MEDICAO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDICAO NO PERÍODO	MEDICAO ACUMULADA	SALDO
1.0			<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>										
1.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORN. E INSTAL. NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO.	M2	R\$ 672,72	6,00	100,00%	6,00	0,00%	R\$ 25.586,88	R\$ 4.036,32	R\$ 25.586,88	R\$ 4.036,32
1.2	COMPOSIÇÃO	002	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1 6	M2	R\$ 897,94	24,00	100,00%	24,00	0,00%	R\$ 177.303,72	R\$ 21.550,56	R\$ 198.854,28	R\$ 21.550,56
2.0			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>										
2.1	SINAPI 08/2022	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	R\$ 21.540,89	6,00	11,00%	0,72	88,00%	R\$ 129.245,34	R\$ 15.509,44	R\$ 144.754,78	R\$ 15.509,44
2.2	SINAPI 08/2022	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	R\$ 8.009,73	6,00	12,00%	0,72	87,00%	R\$ 48.058,38	R\$ 5.767,01	R\$ 53.825,39	R\$ 5.767,01
3.0			<b>RUA DAS PAPOULAS (R0 A E190)</b>										
3.1			<b>SERVÇOS PRELIMINARES</b>										
3.1.1	COMPOSIÇÃO	003	REBAMAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERNO.	UND	R\$ 111,05	113,00	13,00%	15,00	86,00%	R\$ 12.548,65	R\$ 1.665,75	R\$ 14.214,40	R\$ 1.665,75
3.1.2	COMPOSIÇÃO	004	SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, TEODOLITO, NIVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREIDE, ETC.	M2	R\$ 0,46	22.800,00	50,00%	11.400,00	50,00%	R\$ 10.488,00	R\$ 5.244,00	R\$ 15.732,00	R\$ 5.244,00
3.2			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>										
3.2.1	SINAPI 08/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 3,37	22.800,00	50,00%	11.400,00	50,00%	R\$ 76.836,00	R\$ 38.418,00	R\$ 115.254,00	R\$ 38.418,00
3.2.2	SINAPI 08/2022	100976	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$ 10,54	6.840,00	56,00%	3.886,08	43,00%	R\$ 72.093,60	R\$ 40.959,28	R\$ 113.052,88	R\$ 40.959,28
3.2.3	SINAPI 08/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 120,05	2.736,00	50,00%	1.368,00	50,00%	R\$ 328.456,80	R\$ 164.228,40	R\$ 492.685,20	R\$ 164.228,40
3.2.4	SINAPI 08/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,25	79.800,00	50,00%	39.900,00	50,00%	R\$ 179.550,00	R\$ 89.775,00	R\$ 269.325,00	R\$ 89.775,00
3.3			<b>CAPEAMENTO</b>										
3.3.1	COMPOSIÇÃO	007	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E CBUQ	M3	R\$ 120,05	1.140,00	0,00%	-	100,00%	R\$ 136.857,00	R\$ -	R\$ 136.857,00	R\$ -
3.3.2	COMPOSIÇÃO	008	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLOAMENTO, PADRÃO ONIT FAUCA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H, INCLUINDO PRODUTOS EXCETO O ASFÁLTICO	M3	R\$ 480,20	1.140,00	0,00%	-	100,00%	R\$ 547.428,00	R\$ -	R\$ 547.428,00	R\$ -
3.3.3	COMPOSIÇÃO	009	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50-70, INCLUSIVE TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA	T	R\$ 5.824,00	184,16	0,00%	-	100,00%	R\$ 1.072.547,84	R\$ -	R\$ 1.072.547,84	R\$ -
3.3.4	COMPOSIÇÃO	010	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	R\$ 1,21	22.800,00	0,00%	-	100,00%	R\$ 27.588,00	R\$ -	R\$ 27.588,00	R\$ -
3.3.5	COMPOSIÇÃO	011	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS), INCLUSIVE TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A OBRA EM SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	T	R\$ 5.104,60	10,26	0,00%	-	100,00%	R\$ 52.373,19	R\$ -	R\$ 52.373,19	R\$ -
3.3.6	SINAPI 08/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 36,01	7.600,00	15,00%	1.200,00	84,00%	R\$ 273.676,00	R\$ 43.212,00	R\$ 316.888,00	R\$ 43.212,00
											<b>R\$ 2.584.896,51</b>	<b>R\$ 100.836,00</b>	<b>R\$ 2.685.732,51</b>
											<b>R\$ 656.936,40</b>	<b>R\$ 333.380,68</b>	<b>R\$ 990.317,08</b>
											<b>R\$ 25.586,88</b>	<b>R\$ 25.586,88</b>	<b>R\$ 51.173,76</b>
											<b>R\$ 177.303,72</b>	<b>R\$ 21.276,45</b>	<b>R\$ 198.580,27</b>
											<b>R\$ 129.245,34</b>	<b>R\$ 15.509,44</b>	<b>R\$ 144.754,78</b>
											<b>R\$ 48.058,38</b>	<b>R\$ 5.767,01</b>	<b>R\$ 53.825,39</b>
											<b>R\$ 3.769.163,71</b>	<b>R\$ 465.502,75</b>	<b>R\$ 4.234.666,46</b>
											<b>R\$ 23.036,65</b>	<b>R\$ 6.909,75</b>	<b>R\$ 30.946,40</b>
											<b>R\$ 12.548,65</b>	<b>R\$ 1.665,75</b>	<b>R\$ 14.214,40</b>
											<b>R\$ 10.488,00</b>	<b>R\$ 5.244,00</b>	<b>R\$ 15.732,00</b>
											<b>R\$ 656.936,40</b>	<b>R\$ 333.380,68</b>	<b>R\$ 990.317,08</b>
											<b>R\$ 76.836,00</b>	<b>R\$ 38.418,00</b>	<b>R\$ 115.254,00</b>
											<b>R\$ 72.093,60</b>	<b>R\$ 40.959,28</b>	<b>R\$ 113.052,88</b>
											<b>R\$ 328.456,80</b>	<b>R\$ 164.228,40</b>	<b>R\$ 492.685,20</b>
											<b>R\$ 179.550,00</b>	<b>R\$ 89.775,00</b>	<b>R\$ 269.325,00</b>
											<b>R\$ 2.584.896,51</b>	<b>R\$ 100.836,00</b>	<b>R\$ 2.685.732,51</b>
											<b>R\$ 136.857,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 136.857,00</b>
											<b>R\$ 547.428,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 547.428,00</b>
											<b>R\$ 1.072.547,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.072.547,84</b>
											<b>R\$ 27.588,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 27.588,00</b>
											<b>R\$ 52.373,19</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 52.373,19</b>
											<b>R\$ 273.676,00</b>	<b>R\$ 43.212,00</b>	<b>R\$ 316.888,00</b>

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
Dialison Pereira de Oliveira  
CRT-PE: 181613657-3


Secretaria de Infraestrutura  
Tarcísio Cruz Muniz  
Matrícula nº 478163

**SCAVE**  
ENGENHARIA E OBRAS

SCAVE Serviços de Engº e Locação  
ENGº CIVIL JÚLIO CÉSAR S. MARTINS  
CREA RNP 180758279-8 / PE 041.593D  
RESP. TÉCNICO

Engº João Marques de Macedo Neto  
CREA: 1816066710

Sócio ou Responsável Técnico  
da Empresa Contratada




**BOLETIM DE MEDIÇÃO 01**

INÍCIO DA OBRA:	20/04/2023	CONTRATA:	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	ADITIVO DE VALOR:	R\$	% ADITADO	0,00%	SALDO					
TERMINO PREVISTO:	17/10/2023	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:	R\$	% SUPRIMIDO	0,00%	SALDO					
PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS	CONTRATO:	Nº 008/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO	R\$	% TOTAL	4.078.051,56	SALDO					
DATA DE EMISSÃO BM:	05/06/2023												
PERÍODO BM:	20/04/2023												
SINAPI 08/2022 ONERADA, SICRO 04/2022 ONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS ONERADA													
		QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO					
ITEM	FONTES	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
3.3.7	SINAPI 08/2022	94773	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 48,02	7.600,00	15,00%	1.200,00	6.400,00	R\$ 364.952,00	15,00%	57.624,00	R\$ 307.328,00
3.3.8	SINAPI 08/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	R\$ 60,02	1.824,00	0,00%	-	1.824,00	R\$ 109.476,48	0,00%	-	R\$ 109.476,48
3.4			<b>DRENAGEM</b>							<b>R\$ 285.346,12</b>		<b>R\$ 24.376,32</b>	<b>R\$ 260.969,80</b>
3.4.1	SINAPI 08/2022	102747	BOCA PARA BUENHO TRÍPLIO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDADE DE 0°. INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	R\$ 8.403,50	22,00	0,00%	-	22,00	R\$ 184.877,00	0,00%	-	R\$ 184.877,00
3.4.2	COMPOSIÇÃO	005	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA COM TÍDULOS CERÂMICOS MACIÇOS, REVESTIDA INTERAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 2 CM DE ESPESURA, DIMENSÕES INTERNAS: 1,20X1,20X1,5 M, COM SOBRETAMPA DE CONCRETO ARMADO.	UN	R\$ 2.280,91	8,00	0,00%	-	8,00	R\$ 18.247,28	0,00%	-	R\$ 18.247,28
3.4.3	SINAPI 08/2022	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_17/2015	M	R\$ 380,88	143,00	44,00%	64,00	79,00	R\$ 54.465,84	44,00%	24.376,32	R\$ 30.089,52
3.4.4	SINAPI 08/2022	102999	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDAO IN LOCO, ESPESURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M, B=0,7 M, H=0,35 M). AF_08/2021	M	R\$ 138,78	200,00	0,00%	-	200,00	R\$ 27.756,00	0,00%	-	R\$ 27.756,00
3.5			<b>SINALIZAÇÃO</b>							<b>R\$ 2.250,84</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.250,84</b>
3.5.1	COMPOSIÇÃO	006	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$ 187,57	12,00	0,00%	-	12,00	R\$ 2.250,84	0,00%	-	R\$ 2.250,84
3.5.2	SINAPI 08/2022	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	R\$ 125,02	76,00	0,00%	-	76,00	R\$ 9.501,52	0,00%	-	R\$ 9.501,52
3.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M2	R\$ 466,51	9,88	0,00%	-	9,88	R\$ 4.609,11	0,00%	-	R\$ 4.609,11
3.5.4	SINAPI 08/2022	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULDA. AF_05/2021	M	R\$ 6,39	15.200,00	0,00%	-	15.200,00	R\$ 97.128,00	0,00%	-	R\$ 97.128,00
3.5.5	SINAPI 08/2022	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	R\$ 29,36	96,00	0,00%	-	96,00	R\$ 2.818,56	0,00%	-	R\$ 2.818,56
3.5.6	SICRO 04/2022	5219623	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 54,02	1.900,00	0,00%	-	1.900,00	R\$ 102.638,00	0,00%	-	R\$ 102.638,00
4.0			<b>TRAVESSA SEVERINO PEDRO MARCOLINO (E0 à E5)</b>							<b>R\$ 105.997,25</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 105.997,25</b>
4.1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 836,94</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 836,94</b>
4.1.1	COMPOSIÇÃO	003	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	R\$ 111,05	5,00	0,00%	-	5,00	R\$ 555,25	0,00%	-	R\$ 555,25
4.1.2	COMPOSIÇÃO	004	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, TEODOLITO, NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREIDE, ETC.	M2	R\$ 0,46	612,37	0,00%	-	612,37	R\$ 281,69	0,00%	-	R\$ 281,69
4.2			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 31.650,30</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 31.650,30</b>
4.2.1	SINAPI 08/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 3,37	600,00	0,00%	-	600,00	R\$ 2.022,00	0,00%	-	R\$ 2.022,00
4.2.2	SINAPI 08/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$ 10,54	270,00	0,00%	-	270,00	R\$ 2.845,80	0,00%	-	R\$ 2.845,80
4.2.3	SINAPI 08/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVAMENTE TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 120,05	150,00	0,00%	-	150,00	R\$ 18.007,50	0,00%	-	R\$ 18.007,50
4.2.4	SINAPI 08/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,25	3.900,00	0,00%	-	3.900,00	R\$ 8.775,00	0,00%	-	R\$ 8.775,00

*Responsible Técnico Pela Fiscalização*  
 Daniel Pereira de Oliveira  
 CRT-PE: 181613657-3

Secretaria de Infraestrutura  
 Tarcísio Cruz Muniz  
 Matrícula nº 478163

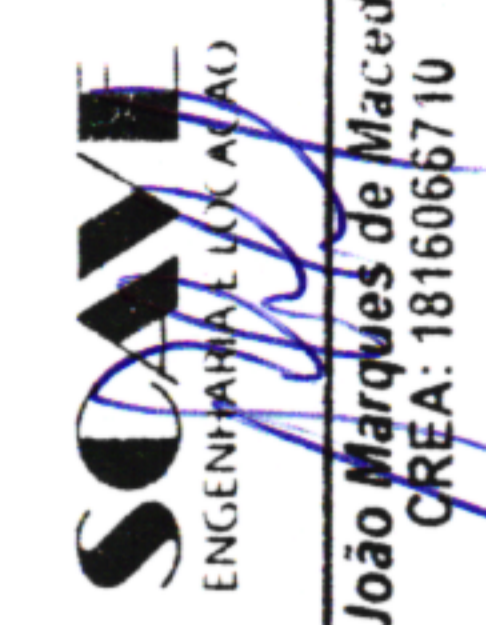

**SCAVE** serviços de Engº e locação  
 ENGº CIVIL JÚLIO CESAR S. MARTINS  
 CREA RNP 1807582/9-1 / PE 041.593D  
 RESP. TÉCNICO

**Engº João Marques de Macedo Nc:**  
 CREA: 1816066710  
 Sócio ou Responsável Técnico  
 da Empresa Contratada

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 01**

INÍCIO DA OBRA:	20/04/2023	CONTRATA:	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	ADITIVO DE VALOR:	R\$	% ADITADO	0,00%	SALDO					
TERMINO PREVISTO:	17/10/2023	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 001/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:	R\$	% SUPRIMIDO	0,00%	SALDO					
PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS	CONTRATO:	N° 008/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO	R\$	% TOTAL	4.078.051,56	SALDO					
DATA DE EMISSÃO BM:	05/06/2023												
PERÍODO BM:	20/04/2023												
SINAPI 08/2022 ONERADA, SICRO 04/2022 ONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS ONERADA		MEDIDNO PERÍODO:											
		BDI		20,05%									
ITEM	FONTI	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
4.3			<b>CAPAMENTO</b>							<b>R\$ 67.564,94</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 67.564,94</b>
4.3.1	COMPOSIÇÃO	007	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E CBUQ	M3	R\$ 120,05	30,00	0,00%	0,00%	30,00	R\$ 3.601,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.601,50
4.3.2	COMPOSIÇÃO	008	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H, INCLUINDO PRODUTOS EXCETO O ASFÁLTICO	M3	R\$ 480,20	30,00	0,00%	0,00%	30,00	R\$ 14.406,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.406,00
4.3.3	COMPOSIÇÃO	009	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50-70, INCLUSIVE TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA	T	R\$ 5.874,00	4,85	0,00%	0,00%	4,85	R\$ 28.246,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.246,40
4.3.4	COMPOSIÇÃO	010	EXECUÇÃO DE PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)	M2	R\$ 1,21	600,00	0,00%	0,00%	600,00	R\$ 726,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 726,00
4.3.5	COMPOSIÇÃO	011	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS), INCLUSIVE TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A OBRA EM SÃO LOURENÇO DA MATA/PE ALTURA AF_06/2016	T	R\$ 5.104,60	0,27	0,00%	0,00%	0,27	R\$ 1.378,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.378,24
4.3.6	SINAPI 08/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	M	R\$ 36,01	200,00	0,00%	0,00%	200,00	R\$ 7.202,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.202,00
4.3.7	SINAPI 08/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	R\$ 48,02	200,00	0,00%	0,00%	200,00	R\$ 9.604,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.604,00
4.3.8	SINAPI 08/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	M3	R\$ 60,02	40,00	0,00%	0,00%	40,00	R\$ 2.400,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,80
4.4			<b>SINALIZAÇÃO</b>							<b>R\$ 5.945,07</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.945,07</b>
4.4.1	COMPOSIÇÃO	006	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$ 187,57	2,00	0,00%	0,00%	2,00	R\$ 375,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 375,14
4.4.2	SINAPI 08/2022	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM AF_03/2022	UN	R\$ 125,02	6,00	0,00%	0,00%	6,00	R\$ 750,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,12
4.4.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + II - CONFECCÃO	M2	R\$ 466,51	0,78	0,00%	0,00%	0,78	R\$ 363,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 363,87
4.4.4	SINAPI 08/2022	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA AGRÍCOLA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA AF_05/2021	M	R\$ 6,39	300,00	0,00%	0,00%	300,00	R\$ 1.917,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.917,00
4.4.5	SICRO 04/2022	5219623	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECCIONAL TIPO III - COM LUM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 54,02	47,00	0,00%	0,00%	47,00	R\$ 2.538,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.538,94
<b>TOTAL DA MEDIÇÃO</b>										<b>R\$ 4.078.051,56</b>	<b>R\$ 512.366,08</b>	<b>R\$ 512.366,08</b>	<b>R\$ 3.565.685,48</b>

quinhentos e doze mil, trezentos e sessenta e seis reais e oito centavos

**SCAVE**  
ENGENHARIA E LOCAÇÃO

**Engº João Marques de Macedo Neto**  
CREA: 1816066710

**SCAVE** Serviços de Engº e Locação

**Engº CIVIL JÚLIO CESAR S. MARTINS**  
CREA RNP 18075822-8 / PE 041-593D  
RESP. TÉCNICO

Secretaria de Infraestrutura  
Tarcísio Cruz Muniz  
Matrícula nº 478163

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
Djalma Pereira de Oliveira  
CRT-PE: 1816.3657-3

Sócio ou Responsável Técnico  
da Empresa Contratada
