



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - LOTE 01

INÍCIO DA OBRA:		09/04/2025		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		0,00%				
TÉRMINO PREVISTO:		09/04/2026		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		0,00%				
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 002/2025 - SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL		0,00%				
DATA DE EMISSÃO:		29/04/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO: PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-01)		PROCESSO:		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024		R\$		1.389.500,00		0,00%				
PERÍODO:		09/04/2025		VALOR DO CONTRATO:		R\$		1.389.500,00		5,58%		5,58%		5,58%				
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024		SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA 2023.2		EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		MEDIDA NO PERÍODO:		77.593,94		% ACUMULADO		5,58%		5,58%				
ITEM	FONTE	DÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO				
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO		
1.0			INSTALAÇÃO DA OBRA										R\$	3.725,40	R\$	-	R\$	3.725,40
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	R\$ 310,45	12,00	-	-	12,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	3.725,40	R\$	-	R\$	3.725,40
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										R\$	42.611,75	R\$	3.602,30	R\$	39.009,43
2.1	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	R\$ 11.462,35	2,00	0,17	0,17	1,83	8,00%	8,00%	91,00%	R\$	22.924,70	R\$	1.948,59	R\$	20.976,10
2.2	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	R\$ 3.937,41	5,00	0,42	0,42	4,58	8,00%	8,00%	91,00%	R\$	19.687,05	R\$	1.653,71	R\$	18.033,33
3.0			SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$	30.503,00	R\$	4.902,45	R\$	25.600,55
3.1	Composições	17015376PM SLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	R\$ 97,61	188,00	39,00	39,00	149,00	20,00%	20,00%	79,00%	R\$	18.350,68	R\$	3.806,79	R\$	14.543,89
3.2	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	R\$ 117,94	54,38	9,29	9,29	45,09	17,00%	17,00%	82,00%	R\$	6.413,57	R\$	1.095,66	R\$	5.317,91
3.3	SINAPI	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAGOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	R\$ 166,97	34,37	-	-	34,37	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	5.738,75	R\$	-	R\$	5.738,75
4.0			MOVIMENTO DE TERRA										R\$	148.873,40	R\$	47.892,63	R\$	100.980,76
4.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 1,74	3.358,58	1.519,87	1.519,87	1.838,71	45,00%	45,00%	54,00%	R\$	5.843,92	R\$	2.644,57	R\$	3.199,35
4.2	Composições	CP-S05103-PMSLM	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	M2	R\$ 6,45	1.888,15	-	-	1.888,15	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	12.178,56	R\$	-	R\$	12.178,56
4.3	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 166,68	406,72	182,38	182,38	224,34	44,00%	44,00%	55,00%	R\$	67.792,08	R\$	30.399,09	R\$	37.392,99
4.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,02	31.217,25	7.350,98	7.350,98	23.866,27	23,00%	23,00%	76,00%	R\$	83.058,84	R\$	14.848,97	R\$	48.209,86
5.0			PAVIMENTAÇÃO										R\$	708.213,97	R\$	21.196,56	R\$	687.017,41
5.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	R\$ 49,84	3.533,26	434,00	434,00	3.099,26	12,00%	12,00%	87,00%	R\$	172.564,41	R\$	21.196,56	R\$	151.367,85
5.2	COMPESA	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	M	R\$ 47,46	90,09	-	-	90,09	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	4.275,67	R\$	-	R\$	4.275,67
5.3	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	R\$ 29,69	1.692,25	-	-	1.692,25	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	50.242,90	R\$	-	R\$	50.242,90
5.4	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 95,38	2.427,30	-	-	2.427,30	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	231.515,87	R\$	-	R\$	231.515,87
5.5	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	R\$ 72,65	1.387,33	-	-	1.387,33	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	100.789,52	R\$	-	R\$	100.789,52
5.6	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 760,44	112,60	-	-	112,60	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	85.625,54	R\$	-	R\$	85.625,54

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163


Maria Janayna da Silva Melo
Engenheira Civil
CREA: 1818666375 PE

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - LOTE 01

INÍCIO DA OBRA:		09/04/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		0,00%	
TÉRMINO PREVISTO:		09/04/2026	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 002/2025 - SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 1.389.500,00		% TOTAL	
DATA DE EMISSÃO:		29/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO: PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-01)		PROCESSO:	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024		% ACUMULADO		5,58%			
PERÍODO:		09/04/2025	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.389.500,00		% DESTA BOM		5,58%			
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI - 07/2024			EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		MEDIDO NO PERÍODO:	R\$ 77.593,94							
SICRO - 04/2024 / ORBE - 06/2024 / COMPESA 2023.2					BDI	28,27%							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
5.7	SINAPI	103925	ESCALA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRIO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPa, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	R\$ 1.641,56	38,50	-	0,00%	38,50	R\$ 63.200,06	-	R\$ -	R\$ 63.200,06
6.0			CONTENÇÕES							R\$ 323.328,26	-	R\$ -	R\$ 323.328,26
6.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 85,27	203,81	-	0,00%	203,81	R\$ 17.378,87	-	R\$ -	R\$ 17.378,87
6.2	COMPESA	02.05.01U	REATERRO APOIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	R\$ 51,70	74,10	-	0,00%	74,10	R\$ 3.830,97	-	R\$ -	R\$ 3.830,97
6.3	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$ 7,82	179,31	-	0,00%	179,31	R\$ 1.402,20	-	R\$ -	R\$ 1.402,20
6.4	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E ÁREA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME ÁREA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	R\$ 511,25	373,51	-	0,00%	373,51	R\$ 190.956,98	-	R\$ -	R\$ 190.956,98
6.5	SINAPI	91081	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE.	M2	R\$ 293,00	263,70	-	0,00%	263,70	R\$ 77.264,10	-	R\$ -	R\$ 77.264,10
6.6	SINAPI	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	R\$ 27,82	211,00	-	0,00%	211,00	R\$ 5.827,82	-	R\$ -	R\$ 5.827,82
6.7	Composições	CP-65000188-PM/SLM	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTÂNCIA ENTRE 30 E 60 M	M3	R\$ 64,67	412,36	-	0,00%	412,36	R\$ 26.687,32	-	R\$ -	R\$ 26.687,32
7.0			DRENAGEM							R\$ 129.982,87	-	R\$ -	R\$ 129.982,87
7.1	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	R\$ 281,00	121,00	-	0,00%	121,00	R\$ 34.001,00	-	R\$ -	R\$ 34.001,00
7.2	Composições	C.P.-19.04.040-PM/SLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	R\$ 43,63	1.133,65	-	0,00%	1.133,65	R\$ 49.481,14	-	R\$ -	R\$ 49.481,14
7.3	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	R\$ 2.754,59	4,00	-	0,00%	4,00	R\$ 11.018,36	-	R\$ -	R\$ 11.018,36
7.4	Composições	CP-103926-PM/SLM	ESCALA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRIO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO FEITO IN LOCO FCK = 15 MPa, LANÇADO MANUALMENTE, SEM ARMAÇÃO, COM MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	R\$ 1.300,17	0,74	-	0,00%	0,74	R\$ 962,12	-	R\$ -	R\$ 962,12
7.5	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	R\$ 80,66	28,00	-	0,00%	28,00	R\$ 2.258,48	-	R\$ -	R\$ 2.258,48
7.6	SINAPI	COMP-92031346	CANALETAS NAS DIMENSÕES INTERNAS (0,40 X 0,40) MM, SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES ESP.= 0,10m, PAREDES EM ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS (14CM), REVESTIDA INTERNAMENTE COM CHAPISCO E MASSA ÚNICA COM CAPIAÇO, INCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.	M	R\$ 219,95	66,70	-	0,00%	66,70	R\$ 14.670,66	-	R\$ -	R\$ 14.670,66
7.7	Composições	CP-95956-PM/SLM	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	R\$ 1.829,91	8,47	-	0,00%	8,47	R\$ 15.499,33	-	R\$ -	R\$ 15.499,33

Responsável Técnico: 
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

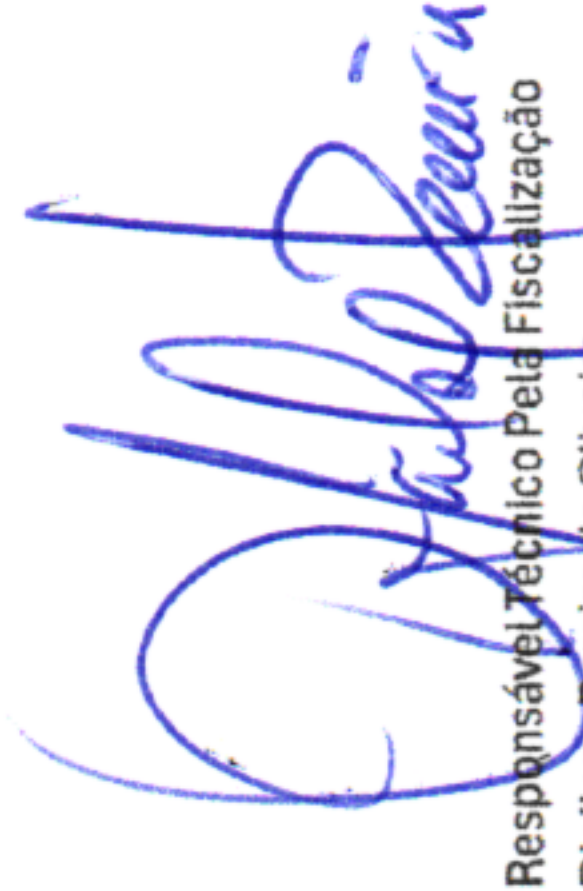
Maria Janayna da Silva Melo
Engenheira Civil
CREA: 1818666375 PE

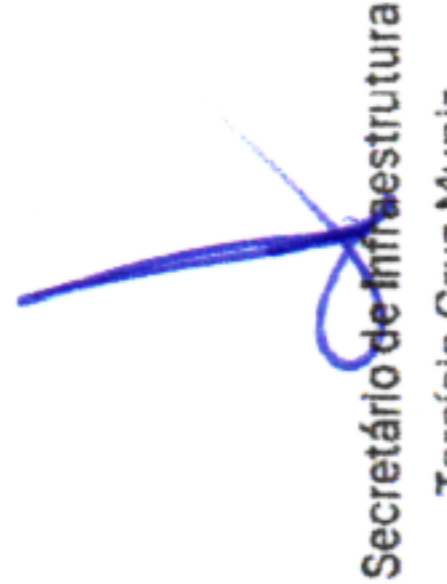
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - LOTE 01

INÍCIO DA OBRA:		09/04/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA				CONTRATADA:	MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP				ADITIVO DE VALOR:		%		ADITADO	0,00%									
TÉRMINO PREVISTO:		09/04/2026	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA				MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024				ADITIVO DE SUPRESSÃO:		%		SUPRIMIDO	0,00%									
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS				CONTRATO:	Nº 002/2025 - SMI/SLM				VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$		1.389.500,00		0,00%								
DATA DE EMISSÃO:		29/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO: PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-01)				PROCESSO:	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024				% ACUMULADO		5,58%												
PERÍODO:		09/04/2025	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE				VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.389.500,00				% DESTA BDI		5,58%												
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024			EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO				MEDIDO NO PERÍODO:	R\$ 77.593,94																		
SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPEA 2023.2							BDI	28,27%																		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	SALDO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO									
7.8	SINAPI	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0º, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021				UND	R\$ 1.055,89	2,00	-	-	2,00	0,00%	R\$ 2.111,78	R\$ 100,00%	0,00%	-	R\$ 2.111,78								
8.0			DIVERSOS										R\$ 2.282,00	R\$ 2.282,00	R\$ -	-	R\$ 2.282,00									
1.1	Composições	CP-802555-PM/SLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS				UN	R\$ 94,25	24,00	-	-	24,00	0,00%	R\$ 2.262,00	R\$ 100,00%	0,00%	-	R\$ 2.262,00								
TOTAL DA MEDIÇÃO			setenta e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e quatro centavos				TOTAL GERAL				R\$ 1.389.500,00				R\$ 77.593,94				R\$ 77.593,94				R\$ 1.311.906,06			


Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163


Maria Sanayna da Silva Melo
Engenheira Civil
CREA: 1818666375 PE
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada
