

</

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 992709

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

SÃO LOURENÇO DA MATA

GOVERNADOR RUY COSTA

CIDADE QUE RECUPERA E REPARA

BOLETIM DE MEDIÇÃO 08 - 2025

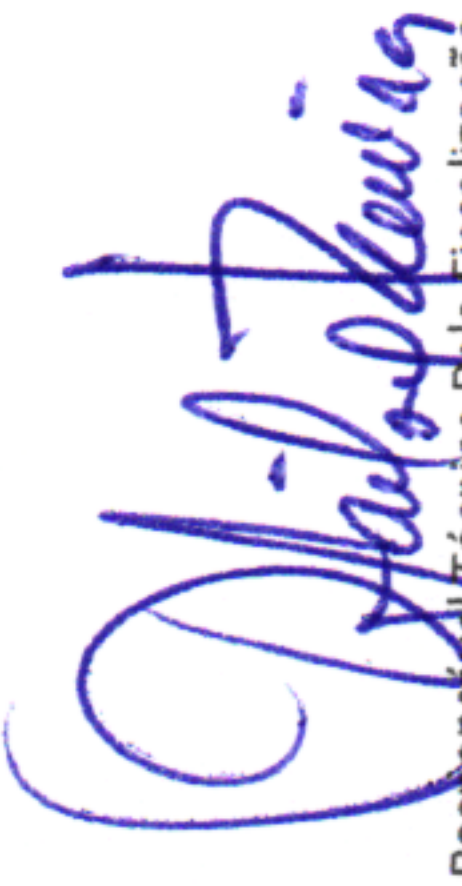
INÍCIO DA OBRA:		18/04/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			CONTRATADA:	HPS CONSTRUTORA EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		R\$	366.247,70	% ADITADO	9,55%	
TÉRMINO PREVISTO:		18/04/2026	PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA			MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA: 015/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$	-	% SUPRIMIDO	0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS			CONTRATO:	Nº 011/2024		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	4.202.857,88	% TOTAL	9,55%	
DATA DE EMISSÃO:		03/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.			PROCESSO:	Nº 035/2023								
PERÍODO:	02/08/2025	01/09/2025	VALOR DO CONTRATO:			R\$	3.836.610,18		% ACUMULADO		2,87%				
			ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE			R\$	120.617,62		% DESTA BM		30,78%				
SINAPI 10/2023 (COM DESONERAÇÃO) E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)			QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
3.9	SINAPI 10/2023	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 304,70	80,00	-	-	80,00	0,00%	R\$ 80,00	100,00%	0,00%	R\$ 24.376,00	R\$ 24.376,00
3.10	SINAPI 10/2023	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 477,40	80,00	-	-	80,00	0,00%	R\$ 80,00	100,00%	0,00%	R\$ 38.192,00	R\$ 38.192,00
3.11	SINAPI 10/2023	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 576,56	60,00	-	-	60,00	0,00%	R\$ 60,00	100,00%	0,00%	R\$ 34.593,60	R\$ 34.593,60
3.12	SINAPI 10/2023	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	R\$ 237,43	200,00	-	-	200,00	0,00%	R\$ 200,00	100,00%	0,00%	R\$ 47.486,00	R\$ 47.486,00
4.0			CONTENÇÕES LATERAIS PARA O PAVIMENTO												
4.1	COMPOSIÇÃO	93	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2	M2	R\$ 136,94	400,00	-	375,42	24,58	0,00%	R\$ 400,00	6,00%	93,00%	R\$ 54.776,00	R\$ 204.982,94
4.2	SINAPI 10/2023	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$ 5,40	664,25	-	490,62	173,63	0,00%	R\$ 664,25	26,00%	73,00%	R\$ 3.586,95	R\$ 937,60
4.3	SINAPI 10/2023	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 51,38	400,00	-	413,78	13,78	0,00%	R\$ 400,00	-3,00%	103,00%	R\$ 20.552,00	R\$ 708,01
4.4	SINAPI 10/2023	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 900,15	300,00	22,59	97,84	202,16	7,00%	R\$ 300,00	67,00%	32,00%	R\$ 270.045,00	R\$ 181.974,32
4.5	SINAPI 10/2023	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	R\$ 575,14	300,00	-	-	300,00	0,00%	R\$ 300,00	100,00%	0,00%	R\$ 172.542,00	R\$ 172.542,00
4.6	SINAPI 10/2023	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	R\$ 582,72	450,00	-	17,13	432,87	0,00%	R\$ 450,00	96,00%	3,00%	R\$ 262.224,00	R\$ 252.242,00
4.7	SINAPI 10/2023	102274	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	R\$ 35,70	80,00	-	4,00	76,00	0,00%	R\$ 80,00	95,00%	5,00%	R\$ 2.856,00	R\$ 2.713,20
4.8	COMPOSIÇÃO	COMP2-99839-PMSLM	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 2" ESPAÇADOS DE 2,00M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", COM 03 TRAVESSAS DE 1 1/2" COM 01 MONTANTE DE 1 1/2" ENTRE AS TRAVESSAS, CHUMBADO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLIS 0,20x0,20x0,40M, INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO.	M2	R\$ 725,16	40,00	-	-	40,00	0,00%	R\$ 40,00	100,00%	0,00%	R\$ 29.006,40	R\$ 29.006,40
4.9	SINAPI 10/2023	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	R\$ 160,88	275,00	-	195,60	79,40	0,00%	R\$ 275,00	28,00%	71,00%	R\$ 44.242,00	R\$ 12.773,87
4.10	SINAPI 10/2023	102670	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021	M	R\$ 151,79	100,00	-	-	100,00	0,00%	R\$ 100,00	100,00%	0,00%	R\$ 15.179,00	R\$ 15.179,00
5.0			REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO												
5.1	SINAPI 10/2023	101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	R\$ 92,57	9.000,00	-	1.191,29	7.808,71	0,00%	R\$ 9.000,00	86,00%	13,00%	R\$ 833.130,00	R\$ 110.277,71
5.2	SINAPI 10/2023	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 68,96	1.775,00	-	717,00	1.058,00	0,00%	R\$ 1.775,00	59,00%	40,00%	R\$ 122.404,00	R\$ 72.959,68
5.3	SINAPI 10/2023	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	R\$ 54,66	400,00	150,00	150,00	250,00	37,00%	R\$ 400,00	62,00%	37,00%	R\$ 21.864,00	R\$ 13.665,00
5.4	SINAPI 10/2023	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 102,53	1.800,00	-	1.303,05	496,95	0,00%	R\$ 1.800,00	27,00%	72,00%	R\$ 184.554,00	R\$ 50.952,28


Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 992709

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 08 - 2025																	
INÍCIO DA OBRA:		18/04/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			CONTRATADA:	HPS CONSTRUTORA EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		R\$	366.247,70	% ADITADO	9,55%			
TÉRMINO PREVISTO:		18/04/2026	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA			MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA: 015/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$	-	% SUPRIMIDO	0,00%			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS			CONTRATO:	Nº 011/2024		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	4.202.857,88	% TOTAL	9,55%			
DATA DE EMISSÃO:		03/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS , NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.			PROCESSO:	Nº 095/2023										
PERÍODO:		02/08/2025	VALOR DO CONTRATO:				R\$	3.836.610,18	% ACUMULADO	2,87%							
SINAPI 10/2023 (COM DESONERAÇÃO) E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE			MEDIDO NO PERÍODO:		R\$	120.617,62	30,78%							
			EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)			QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID.	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
5.5	COMPOSIÇÃO	18.02.168	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA OU CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3. (EXCLUSO O MEIO-FIO)		M		R\$ 17,44	850,00	-		850,00	0,00%	R\$ 14.824,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.824,00	
6.0			DIVERSOS										R\$ 334.413,84	R\$ 45.383,90	R\$ 113.459,76	R\$ 220.954,08	
6.1	SINAPI 10/2023	5680	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP		R\$ 173,08	750,00	144,00	360,00	390,00	19,00%	R\$ 129.810,00	R\$ 24.923,52	R\$ 62.308,80	R\$ 67.501,20	
6.2	COMPOSIÇÃO	18.02.169	CAMINHÃO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5,0T (INCL MANUT/OPERAÇÃO) (MÊS)		MÊS		R\$ 17.050,32	12,00	1,20	3,00	9,00	9,00%	R\$ 204.603,84	R\$ 20.460,38	R\$ 51.150,96	R\$ 153.452,88	
7.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										R\$ 185.245,44	R\$ 8.713,58	R\$ 48.598,52	R\$ 136.646,90	
7.1	SINAPI 10/2023	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H		R\$ 124,51	768,00	10,00	102,40	665,60	1,00%	R\$ 95.623,68	R\$ 1.245,10	R\$ 12.749,82	R\$ 82.873,85	
7.2	SINAPI 10/2023	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		MES		R\$ 7.468,48	12,00	1,00	4,80	7,20	8,00%	R\$ 89.621,76	R\$ 7.468,48	R\$ 35.848,70	R\$ 53.773,05	
TOTAL DA MEDIÇÃO			cento e vinte mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos							TOTAL GERAL				R\$ 4.202.857,88	R\$ 120.617,62	R\$ 1.293.658,07	R\$ 2.909.199,81


Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Peleira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA-PE: 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 992709

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada
