



851/A



## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

O fundo municipal de saúde de Santa Cruz do Capibaribe-PE, inscrito no CNPJ sob o nº11.196.515/0001-25, atesto para os devidos fins que a empresa M&M empreendimentos e incorporação Ltda de CNPJ: 17.633.457/0001-36 neste ato representada pelo responsável técnico pela obra, o sr. Marcelo César Marques Medeiros, que a empresa abaixo descrita, executou o contrato seguinte: Contratação de empresa de engenharia para a construção de 04(quatro) unidades básicas de saúde: UBS DONA LICA II, localizada no endereço ao lado da quadra 41, S/N, Loteamento Dona Lica II; UBS SANTA FILOMENA, Localizada ao lado da quadra B6, S/N, Loteamento Santa Filomena I; UBS NOVA SANTA CRUZ, Localizada a rua Luiza Mendes, S/N, Bairro Nova Santa Cruz; e UBS ACAUÃ, localizada nas quadras H e I, S/N, Conjunto residencial Acauã/Jaçanã, no período de 24/08/2017-18/08/2018 e sendo todas situadas neste município de Santa Cruz do Capibaribe-PE, Objetos da proposta SISMOB nº 11196.5150001/15-003, licitação nº 054/2017, contrato nº 074/2017, executadas pela empresa M&M empreendimentos e incorporação Ltda de CNPJ: 17.633.457/0001-36, localizada à Av. Agamenon Magalhães 444, sala 302, andar 8, empresarial difusora, Maurício de Nassau, Caruaru-PE, FORAM CONCLUÍDAS nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas, incluindo a portaria GM/MS/MS nº 381 de 06 de fevereiro de 2017 e das exigências descritas na portaria nº 340/GM/MS, de 04 de março, de 2013 que define a componente construção do programa de requalificação de unidades básicas de saúde(UBS) conforme planilha em anexo.

Santa Cruz do Capibaribe, 18 de Agosto de 2018.

  
André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB  
(Assinatura do fiscal de obra)

**André Luís Bezerra**  
Nº CREA: 9960 PB

  
Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D  
(Assinatura do responsável técnico da empresa)

**Marcelo César Marques Medeiros**  
Nº CREA: 5488-7

  
Inácio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018  
(Assinatura do Secretário Municipal de Saúde)

**Inácio Marques Vieira**  
CPF: 089.913.984-13

Página 1 de 36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41  
Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas




SEINFRA  
FOLHA

830/A

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE

## PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS

UBS DONA LICA 2			
ITEM	SERVIÇOS	UND	Quantitativo executado
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA. (MOD.AV-43/2000).	M2	6,00
1.2	BARRACAO PARA ESCRITORIO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA , COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1 6	M2	6,00
1.3	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1 6.	M2	0,35
1.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHA- PAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM.	M2	210,00
1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 63A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UND	1,00
1.6	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.	M2	812,50
1.7	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	179,20
1.8	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	19,10
1.9	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUALREATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA , COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	10,00
1.10	EXECUCAO DE ATERRO COM BARRO, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE DE COMPACTACAO,INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	53,76
<b>2</b>	<b>CONCRETO ARMADO</b>		
<b>2.1</b>	<b>FUNDAÇÃO( SAPATA E ARRANQUE DE PILARES)</b>		
2.1.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	M2	12,01
2.1.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	7,43
2.1.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	387,10
2.1.4	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	64,51
<b>2.2</b>	<b>ESTRUTURA( BALDRAME, PILARES E VIGAS)</b>		
2.1.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	25,41
2.1.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1752,30

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 2 de 36

Ínacio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



55



2.1.4	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	430,02
2,3	<b>LAJE</b>		
2.3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	179,20
3	<b>ALVENARIA</b>		
3,1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	115,50
3,2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	38,00
3,3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,70
3.4	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.	M2	570,00
3.5	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ.-EMLURB/2014	M2	34,00
4	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>		
4,1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3.	M2	1110,00
4,2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	1110,00
4,3	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA NO TRACO 1:2, COM 5,0 MM DE ESPESSURA.	M2	961,78
4.4	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	148,22
5	<b>REVESTIMENTOS DE PISO</b>		
5,1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8.	M2	179,20
5.2	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	M2	179,20
5.3	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA E JUNTAS DE VIDRO FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, E COM ACABAMENTO LISO.	M2	135,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 3 de 36

Indício Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luís Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB



W 56

SLS/A

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE

5.4	PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5 ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).	M2	179,20
5.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X 45CM. AF_06/2014	M	153,67
5.6	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	M2	70,00
5.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1 2	M	43,48
6	<b>PINTURA</b>		
6.1	PINTURA A BASE DE EMULSAO ACRILICA, CORALPLUS OU SIMILAR, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAOS E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA.	M2	305,49
6.2	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAOS DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA.	M2	656,29
6.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS.AF_06/2014	M2	179,20
6.4	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETI- CO NIVELADOR BRANCO FOSCO, DUAS DEMAOS, COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS.	M2	46,62
6.5	PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO,NO VACOR OU SIMILAR PARA PISOS DE QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, PASSEIOS, ETC(02 DEMAOS),INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA, SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	M2	135,12
7	<b>ESQUADRIAS</b>		
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	14,00
7.2	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, TIPO CORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2	13,42

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 4 de 36

Inácio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021




Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



254

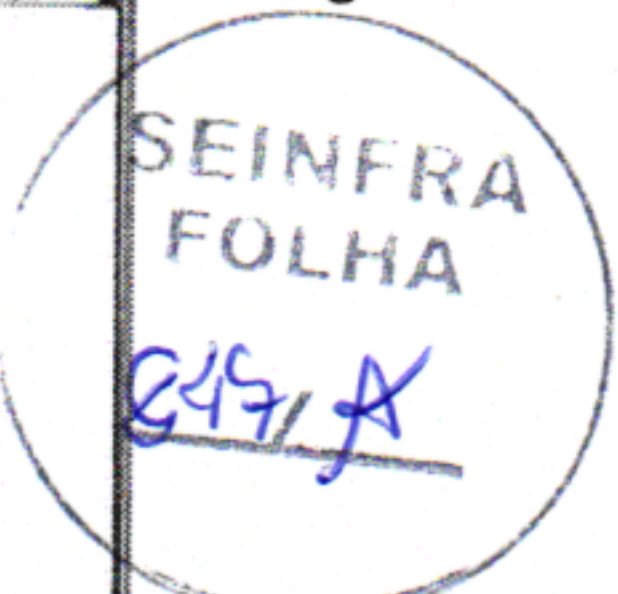

7.3	EA.02 - ESQUADRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, INCOLOR, COM 04 FOLHAS, SENDO 02 DE GIRO (1.10 X 2.10) E 02 FIXAS (1.10 X 2.10), E BANDEIRAS FIXAS. FERRAGENS ESPECÍFICAS, INCLUSIVE PUXADOR TIPO ALÇA EM AÇO INOX, TUBO RETANGULAR EM ALUMÍNIO 2"x4", CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL, FERRAGENS ESPECÍFICA E JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME DETALHE DE PROJETO.	UND	1,00
7.4	PORTÃO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO ( 3,20 x 2,10 )	UND	1,00
7.5	GRADES PARA JANELAS EM ESQUADRIA DE FERRO	M2	13,42
7.6	APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM VIDROS	M2	21,82
8	<b>COBERTA</b>		
8.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2015	M2	179,20
8.2	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6 MM DE ESPESSURA, SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL.	M2	179,20
8.3	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	72,00
8.5	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	25,00
9	<b>FORRO</b>		
9.1	FORRO DE GESSO APLICADO EM LAJE PRE-MOLDADA.	M2	179,20
10	<b>DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO</b>		
10.1	FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CORTE PARA UMA CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M2	3,57
10.3	FORNECIMENTO DE RESPALDO DE 15CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M	9,25
10.4	FORNECIMENTO DE TESTEIRA DE 15CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M	12,00
10.6	SOLEIRA DE GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRACO 1:1:4, LARGURA DE 15CM E ESPESSURA DE 2CM.	M	19,30
11	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
11.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41  
Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 5 de 36

André Luís Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PR  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018



Handwritten initials 'W 58' and a signature

SEINFRA  
FOLHA

846/A

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE

11.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIM PLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CE LITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	5,00
11.4	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	2,00
11.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL, MEKAL OU SIMILAR, NAS DIMENSOES 0,40 X 0,34 X 0,15 M, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	5,00
11.6	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE DE PLASTICO, DIAM. 1/2 POL. TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	1,00
11.8	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL., COM AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMI- LAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	5,00
11.9	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVA TORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL., REF.1193, LINHA C-33, SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	5,00
11.10	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANO- PLA ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, DECA 50 OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	1,00
11.11	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39, DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	13,00
11.12	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39, DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 1.1/2 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	1,00
11.13	INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA DE PVC (CAPACIDADE DE 2000 LITROS), INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MESMA, COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES.	UND	1,00
11.14	INSTALACAO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM.3/4 POL., INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	UND	1,00
11.15	BARRA PARA APOIO, 80 CM, LINHA CONFORTO, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	UND	2,00
12	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENOS</b>		
12.1	<b>INSTALAÇÕES DE ESGOTO</b>		
12.1.1	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	2,00
12.1.2	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	7,00
12.1.3	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	5,00

Página 6 de 36

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Inácio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PP


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



n 59

S/A

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE

12.1.4	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	13,00
12.1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.50 MM, PARA VENTILACAO DE ESGOTO.	M	40,00
12.1.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.75 MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS.	M	15,00
12.1.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	52,00
12.1.8	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTER NAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M.	UND	13,00
12.1.9	CAIXA DE GORDURA COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 X 0,50 M COM CHICANA DE CONCRETO.	UND	1,00
12,2	<b>INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICAS</b>		
12.2.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	20,00
12.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	1,52
12.2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	3,61
12.2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 32 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	44,69
12.2.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	42,00
12,3	<b>DRENOS</b>		
12.3.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA. PARA AR CONDICIONADO	M	30,00

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 7 de 36

Inácio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBESEINFRA  
FOLHA

844A

12.3.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	25,00
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
13.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRI- BUICAO.	PT	49,00
13.2	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	13,00
13.3	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	2,00
13.4	PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	2,00
13.5	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	64,00
13.6	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	5,00
13.7	FORNECIMENTO DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR COM ALETAS DE ALUMINIO ANODIZADO 2X32W, FEA 02 LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA, REA TOR ELETRONICO, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO	UND	23,00
13.8	FORNECIMENTO DE LUMINARIA ARANDELA DE ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA, AE 01 (P) 15W, LUMALUX OU SIM., INCLUSIVE LAMPADA FLUO RESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 15W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO.	UND	20,00
13.9	FORNECIMENTO DE LUMINARIA REDONDA DE SOBREPOR DE ALUMINIO PINTADO E DIFUSOR DE VIDRO FOSCO COR BRANCA, PFD 03-2X20W, LUMALUX OU SIM., INC LUSIVE LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA ELETRO NICA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO	UND	6,00
13.10	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PA- RALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UND	4,00

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 8 de 36

Inácio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas





SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBESEINFRA  
FOLHA

843/A

13.11	ASSENTAMENTO DE CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA, 15A, SUPERIOR OU INFERIOR MARCA LENZ OU SIMILAR (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UND	1,00
13.12	CABO DE COBRE NU 25MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00
13.13	CABO DE COBRE NU 35MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
13.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1602,80
13.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	49,20
13.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,70
13.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	117,80
13.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
13.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 50X50X3000, COM TODOS OS COMPONENTES PARA FIXAÇÃO EM LAJE.	UND	41,60
13.20	TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 4 X 2 POL., 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	UND	64,00
13.22	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SECCAO PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	UND	15,00
13.23	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE TRES SECCOES PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	UND	2,00
13.24	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDIÇÃO TRIFÁSICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFÁSICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE BUCHAS PLÁSTICAS E PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS EM PAREDE (PADRÃO CELPE) SEM DISJUNTOR.	UND	1,00
13.25	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
13.26	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00
13.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
14	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>		

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 9 de 36

Ínacio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021




Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE



SEINFRA FOLHA

842/A

14,1	<b>REDE FRIGORÍFICA</b>		
14.1.1	TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 3/8" OU SIMILAR	M	6,00
14,2	<b>INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORÍFICA</b>		
14.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø3/8" OU SIMILAR	M	6,00
14.2.4	INSTALAÇÃO DE TUBO ARMAFLEX Ø 3/8" X 19MM OU SIMILAR	M	6,00
15	<b>RESERVATÓRIO DE 18.000,00 LITROS</b>		
15.1	ESCAVACAO E CARGA MECANICAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO, E AINDA TRANSPORTE COM D.M.T. 0,2 KM.	M³	22,95
15.2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M³	0,90
15.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1,08
15.4	LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO COM VAO NORMAL,INCLUSIVE CAPEAMNTO E ESCORAMENTO.	M²	9,00
15.5	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESURA.	M²	9,00
15.6	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M²	30,60
15.7	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3.	M²	30,60
15.8	IMPERMEABILIZACAO,EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:3 COM SIKA 1 -ESPESSURA DE 3 CM.	M²	39,60
15.9	FORNECIMENTO DE BOMBA 3/4 HP, INCLUSIVE ACESSORIOS, FIXACAO E INSTALACAO.	UNID.	1,00
15.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDA-VEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 32 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	10,00
16	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>		
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	812,50
<b>UBS NOVA SANTA CRUZ</b>			
ITEM	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO Quantidades
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1,1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA. (MOD.AV-43/2000).	M2	6,00
1,2	BARRACAO PARA ESCRITORIO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1 6	M2	0,00
1,3	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1 6.	M2	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41  
Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Inácio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB



Handwritten signature

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBESEINFRA  
FOLHA

841/A

1,4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM.	M2	230,79
1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 63A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UND	1,00
1,6	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.	M2	500,00
1,7	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	196,60
1,8	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	62,35
1.9	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUALREATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	12,74
1.10	EXECUCAO DE ATERRO COM BARRO, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE DE COMPACTACAO, IN- CLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	19,66
1.11	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ.-EMLURB/2014	M2	24,27
2	<b>CONCRETO ARMADO</b>		
2,1	<b>FUNDAÇÃO( SAPATA E ARRANQUE DE PILARES)</b>		
2.1.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	M2	11,15
2.1.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,60
2.1.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	350,60
2.1.4	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	50,18
2,2	<b>ESTRUTURA( BALDRAME, PILARES E VIGAS)</b>		
2.1.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	24,98
2.1.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1654,50
2.1.4	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	453,23
2,3	<b>LAJE</b>		
2.3.1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	196,96
3	<b>ALVENARIA</b>		

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 11 de 36

Marcelo Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



64

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBESEINFRA  
FOLHA

540/A

3,1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	124,00
3,2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	38,00
3,3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	28,60
3.4	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.	M2	610,00
4	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>		
4,1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3.	M2	930,00
4,2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	930,00
4,3	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA NO TRACO 1:2, COM 5,0 MM DE ESPESSURA.	M2	781,78
4.4	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	148,22
5	<b>REVESTIMENTOS DE PISO</b>		
5,1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8.	M2	206,56
5.2	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	M2	206,56
5.3	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA E JUNTAS DE VIDRO FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, E COM ACABAMENTO LISO.	M2	9,60
5.4	PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5 ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).	M2	196,96
5,5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X 45CM. AF_06/2014	M	240,00
5.6	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	M2	125,31
5.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE	M	85,00

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 12 de 36

Marcelo Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas





CIMENTO E A REIA 1 2			
<b>6</b>	<b>PINTURA</b>		
6.1	PINTURA A BASE DE EMULSAO ACRILICA, CORALPLUS OU SIMILAR, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMA0 E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA.	M2	305,49
6.2	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMA0 DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA.	M2	624,51
6.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS.AF_06/2014	M2	196,96
6.4	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETI- CO NIVELADOR BRANCO FOSCO, DUAS DEMAOS, COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS.	M2	50,82
6.5	PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO,NO VACOR OU SIMILAR PARA PISOS DE QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, PASSEIOS, ETC(02 DEMAOS),INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA, SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	M2	9,60
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	14,00
7.2	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, TIPO CORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2	21,52
7.3	EA.02 - ESQUADRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, INCOLOR,COM 04 FOLHAS, SENDO 02 DE GIRO (1.10 X 2.10) E 02 FIXAS (1.10 X 2.10), E BANDEIRAS FIXAS. FERRAGENS ESPECÍFICAS, INCLUSIVE PUXADOR TIPO ALÇA EM AÇO INOX,TUBO RETANGULAR EM ALUMÍNIO 2"x4", CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL, FERRAGENS ESPECÍFICA E JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME DETALHE DE PROJETO.	UND	1,00
7.4	PORTÃO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO ( 3,20 x 2,10 )	UND	1,00
7.5	GRADES PARA JANELAS EM ESQUADRIA DE FERRO	M2	21,52
7.6	APLICACAO DE PELÍCULA EM VIDROS	M2	21,52
<b>8</b>	<b>COBERTA</b>		
8.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE	M2	196,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41  
Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 13 de 36

Ináete Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

Andre Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



*Handwritten mark*

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE



SEINFRA  
FOLHA

838/A

VERTICAL.AF_12/2015			
8.2	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6 MM DE ESPESSURA, SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL.	M2	196,96
8,3	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	107,98
8,5	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	20,00
9	<b>FORRO</b>		
9,1	FORRO DE GESSO APLICADO EM LAJE PRE-MOLDADA.	M2	196,96
10	<b>DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO</b>		
10.1	FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CORTE PARA UMA CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M2	5,72
10.3	FORNECIMENTO DE RESPALDO DE 15CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M	18,56
10.4	FORNECIMENTO DE TESTEIRA DE 15CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M	14,80
10.6	SOLEIRA DE GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMEN TO, CAL HIDRATADA E AREIA TRACO 1:1:4, LARGURA DE 15CM E ESPESSURA DE 2CM.	M	18,95
11	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
11.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	2,00
11.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIM PLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CE LITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	2,00
11,4	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	2,00
11.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL, MEKAL OU SIMILAR, NAS DIMENSOES 0.40 X 0,34 X 0,15 M, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	8,00
11,6	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE DE PLASTICO, DIAM. 1/2 POL. TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	UND	1,00
11.8	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL., COM AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA	UND	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas

Página 14 de 36

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Inácio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB



69

SEINFRA  
FOLHA

837/A

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE

OU SIMI-LAR, INCLUSIVE FIXACAO.			
11.9	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVA TORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL., REF. 1193, LINHA C-33, SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	UND	2,00
11.10	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANO- PLA ACABAMENTO CROMADO, REF. 1416, DECA 50 OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UND	1,00
11.11	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1509-C39, DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UND	12,00
11.12	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1509-C39, DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 1.1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UND	1,00
11.13	INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA DE PVC (CAPACIDADE DE 2000 LITROS), INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MESMA, COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES.	UND	1,00
11.14	INSTALACAO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM. 3/4 POL., INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	UND	1,00
11.15	BARRA PARA APOIO, 80 CM, LINHA CONFORTO, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	UND	2,00
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENOS</b>		
<b>12.1</b>	<b>INSTALAÇÕES DE ESGOTO</b>		0,00
12.1.1	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	2,00
12.1.2	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	10,00
12.1.3	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	2,00
12.1.4	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	12,00
12.1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM. 50 MM, PARA VENTILACAO DE ESGOTO.	M	20,00
12.1.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	90,00
12.1.7	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDOEM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTER NAS 0,60 X 0,60 M, COM	UND	11,00

Página 15 de 36

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Inácio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41


Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



SEINFRA  
FOLHA

36/A



	PROFUNDIDADE ATE 1,0M.		
12.1.8	CAIXA DE GORDURA COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50X 0,50 X 0,50 M COM CHICANA DE CONCRETO.	UND	1,00
12,2	<b>INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICAS</b>		0,00
12.2.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	17,00
12.2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 32 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	3,00
12.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	104,00
12,3	<b>DRENOS</b>		0,00
12.3.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA. PARA AR CONDICIONADO	M	20,00
12.3.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	25,00
13	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
13.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	49,00
13.2	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	15,00
13.3	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	1,00
13.4	PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41  
Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D


Página 16 de 36

Inácio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luís Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB







SEINFRA FOLHA

835/A

13.5	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	60,00
13.6	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TU BULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DE MAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	5,00
13.7	FORNECIMENTO DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE EM- BUTIR COM ALETAS DE ALUMINIO ANODIZADO 2X32W, FEA 02 LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA, REA TOR ELETRONICO,DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO	UND	23,00
13.8	FORNECIMENTO DE LUMINARIA ARANDELA DE ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA, AE 01 (P) 15W, LUMALUX OU SIM., INCLUSIVE LAMPADA FLUO RESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 15W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO.	UND	20,00
13.9	FORNECIMENTO DE LUMINARIA REDONDA DE SOBREPOR DE ALUMINIO PINTADO E DIFUSOR DE VIDRO FOSCO COR BRANCA, PFD 03-2X20W, LUMALUX OU SIM., INCLUSIVE LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO	UND	6,00
13.10	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR,COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UND	4,00
13.11	ASSENTAMENTO DE CHAVE DE BOIA AUTOMATICA,15A, SUPERIOR OU INFERIOR MARCA LENZ OU SIMILAR(IN CLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UND	1,00
13,12	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
13,13	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00
13,14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1602,80
13,15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	49,20
13,16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,70
13,17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	62,70
13,18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	117,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas

Página 17 de 36

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Inácio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB



SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBESEINFRA  
FOLHA

834A

13,19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,70
13,2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 50X50X3000, COM TODOS OS COMPONENTES PARA FIXAÇÃO EM LAJE.	UND	41,60
13,21	TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 4 X 2 POL., 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND	60,00
13,22	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SECCAO PARA CAI XA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND	16,00
13,23	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE TRES SECCOES PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND	1,00
13,24	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE BUCHAS PLASTICAS E PARAFUSOS PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM PAREDE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR.	UND	1,00
13,25	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
13,26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	15,00
13,27	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
<b>14</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>		
<b>14,1</b>	<b>REDE FRIGORÍFICA</b>		
14.1.1	TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 3/8" OU SIMILAR	M	12,00
<b>14,2</b>	<b>INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORÍFICA</b>		
14.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø3/8" OU SIMILAR	M	12,00
14.2.4	INSTALAÇÃO DE TUBO ARMAFLEX Ø 3/8" X 19MM OU SIMILAR	M	12,00
<b>15</b>	<b>RESERVATÓRIO DE 18.000,00 LITROS</b>		
15.1	ESCAVACAO E CARGA MECANICAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO, E AINDA TRANSPORTE COM D.M.T. 0,2 KM.	M <sup>3</sup>	22,95
15,2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M <sup>3</sup>	0,90
15,3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M <sup>3</sup>	1,08
15,4	LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO.	M <sup>2</sup>	9,00

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 18 de 36

Inácio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



SEINFRA  
FOLHA

833/A

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE

15,5	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES-SURA.	M²	9,00
15,6	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M²	30,60
15,7	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3.	M²	30,60
15,8	IMPERMEABILIZACAO,EMPREGANDO ARGAMASSA DE CI- MENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:3 COM SIKA 1 -ESPESSURA DE 3 CM.	M²	39,60
15,9	FORNECIMENTO DE BOMBA 3/4 HP, INCLUSIVE ACESSORIOS, FIXACAO E INSTALACAO.	UNID.	1,00
15.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDA-VEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 32 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	10,00
<b>16</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>		
16,1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	500,00
<b>UBS ACAUÁ</b>			
ITEM	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO Quantidades
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1,1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA. (MOD.AV-43/2000).	M2	6,00
1,2	BARRACAO PARA ESCRITORIO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA , COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1 6	M2	5,00
1,3	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1 6.	M2	11,71
1,4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHA- PAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM.	M2	210,00
1,5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 63A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UND	1,00
1,6	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.	M2	400,00
1,7	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	335,56
1,8	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	31,44
1,9	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUALREATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESURA , COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	7,93
1.10	EXECUCAO DE ATERRAMENTO COM BARRO, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE DE COMPACTACAO,IN- CLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	80,80

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 19 de 36

Inácio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luís Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019

13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBESEINFRA  
FOLHA

832/A

1.11	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ.-EMLURB/2014	M2	65,00
<b>2</b>	<b>CONCRETO ARMADO</b>		
<b>2,1</b>	<b>FUNDAÇÃO( SAPATA E ARRANQUE DE PILARES)</b>		
2.1.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	M2	21,10
2.1.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	8,47
2.1.3	ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	400,00
2.1.4	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	50,20
<b>2,2</b>	<b>ESTRUTURA( BALDRAME, PILARES E VIGAS)</b>		
2.1.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	29,00
2.1.3	ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2350,00
2.1.4	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	450,00
<b>2,3</b>	<b>LAJE</b>		
2.3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	335,56
<b>3</b>	<b>ALVENARIA</b>		
3,1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	170,00
3,2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	35,31
3,3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	39,60
3.4	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.	M2	610,00
3.4	EMLURB_07.03.020-MURO COM EMBASAMENTO DE 50 CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.	M	110,00
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>		

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 20 de 36

Indício Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



SEINFRA  
FOLHA

831/A

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE

4,1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3.	M2	1230,00
4,2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	1230,00
4,3	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA NO TRACO 1:2, COM 5,0 MM DE ESPESSURA.	M2	1041,34
4,4	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	188,66
5	<b>REVESTIMENTOS DE PISO</b>		
5,1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8.	M2	301,37
5,3	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA E JUNTAS DE VIDRO FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, E COM ACABAMENTO LISO.	M2	9,00
5,4	PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PEI5 ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).	M2	335,56
5,6	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	M2	172,02
5,7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1 2	M	39,45
6	<b>PINTURA</b>		
6,1	PINTURA A BASE DE EMULSAO ACRILICA, CORALPLUS OU SIMILAR, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAOS E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA.	M2	430,12
6,2	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAOS DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA.	M2	611,22
6,3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS.AF_06/2014	M2	301,37
6,4	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETI- CO NIVELADOR BRANCO FOSCO, DUAS DEMAOS, COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS.	M2	92,40

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 21 de 36

Marcelo Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41  
Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



SEINFRA  
FOLHA

83/A

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE

6.5	PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO,NO VACOR OU SIMILAR PARA PISOS DE QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, PASSEIOS, ETC(02 DE MAOS),INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA, SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO.	M2	9,00
7	<b>ESQUADRIAS</b>		
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃOPOPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	25,00
7.2	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, TIPO CORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2	21,69
7.3	EA.02 - ESQUADRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, INCOLOR,COM 04 FOLHAS, SENDO 02 DE GIRO (1.10 X 2.10) E 02 FIXAS (1.10 X 2.10), E BANDEIRAS FIXAS. FERRAGENS ESPECÍFICAS, INCLUSIVE PUXADOR TIPO ALÇA EM AÇO INOX,TUBO RETANGULAR EM ALUMÍNIO 2"x4", CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL, FERRAGENS ESPECÍFICA E JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME DETALHE DE PROJETO.	UND	1,00
7.4	PORTÃO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO ( 3,20 x 2,10 )	UND	1,00
7.5	GRADES PARA JANELAS EM ESQUADRIA DE FERRO	M2	21,69
7.6	APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM VIDROS	M2	21,69
8	<b>COBERTA</b>		
8.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_12/2015	M2	308,58
8.2	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6 MM DE ESPESSURA, SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL.	M2	308,58
8.3	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	101,00
8.5	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	34,00
9	<b>FORRO</b>		
9.1	FORRO DE GESSO APLICADO EM LAJE PRE-MOLDADA.	M2	301,37
10	<b>DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO</b>		
10.1	FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CORTE PARA UMA CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M2	5,00

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 22 de 36

Inácio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41  
Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



SEINFRA  
FOLHA

829 A

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE

10.2	FORNECIMENTO DE RESPALDO DE 15CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTA- GEM E ASSENTAMENTO.	M	14,70
10.3	FORNECIMENTO DE TESTEIRA DE 15CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTA- GEM E ASSENTAMENTO.	M	16,80
11	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
11.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	4,00
11.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CE LITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	9,00
11.4	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	2,00
11.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL, MEKAL OU SIMILAR, NAS DIMENSOES 0.40 X 0.34 X 0.15 M, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	7,00
11.6	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE DE PLASTICO, DIAM. 1/2 POL. TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	1,00
11.8	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL., COM AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	7,00
11.9	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL., REF.1193, LINHA C-33, SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	12,00
11.10	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANO- PLA ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, DECA 50 OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	1,00
11.11	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANO- PLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39, DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	19,00
11.12	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANO- PLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39, DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 1.1/2 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	1,00
11.13	INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA DE PVC (CAPACIDADE DE 2000 LITROS), INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MESA, COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES.	UND	1,00

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 23 de 36

Marcelo Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBESEINFRA  
FOLHA

11,14	INSTALACAO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM.3/4 POL., INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	UND	1,00
11,15	BARRA PARA APOIO, 80 CM, LINHA CONFORTO, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	UND	2,00
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENOS</b>		
<b>12,1</b>	<b>INSTALAÇÕES DE ESGOTO</b>		
12.1.1	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	4,00
12.1.2	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	7,00
12.1.3	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	10,00
12.1.4	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	18,00
12.1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.50 MM, PARA VENTILACAO DE ESGOTO.	M	25,00
12.1.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	34,00
12.1.7	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M.	UND	18,00
12.1.8	CAIXA DE GORDURA COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50X 0,50 X 0,50 M COM CHICANA DE CONCRETO.	UND	1,00
<b>12,2</b>	<b>INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICAS</b>		
12.2.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	29,00
12.2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 32 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	40,00
12.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	20,00
<b>12,3</b>	<b>DRENOS</b>		

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 24 de 36

Inácio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas





SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBESEINFRA  
FOLHA

829/A

12.3.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC RÍGIDO DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE ÁGUA. PARA AR CONDICIONADO	M	25,00
12.3.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	30,00
13	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
13.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIAÇÃO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT	78,00
13.2	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	PT	23,00
13.3	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	PT	1,00
13.4	PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	PT	1,00
13.5	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT	104,00
13.6	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EM-BUTIR COM ALETAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO 2X32W, FEA 02 LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA, REATOR ELETRÔNICO, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND	40,00
13.7	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA ARANDELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA, AE 01 (P) 15W, LUMALUX OU SIM., INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 15W, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO.	UND	27,00
13.8	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA REDONDA DE SOBREPOR DE ALUMÍNIO PINTADO E DIFUSOR DE VIDRO FOSCO COR BRANCA, PFD 03-2X20W, LUMALUX OU SIM., INCLUSIVE LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 20W, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND	9,00
13.9	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UND	4,00

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 25 de 36

André Luís Bezerra  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luís Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



SEINFRA  
FOLHA

826/A

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE

13,10	ASSENTAMENTO DE CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA, 15A, SUPERIOR OU INFERIOR MARCA LENZ OU SIMILAR (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UND	1,00
13,11	CABO DE COBRE NU 25MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
13,12	CABO DE COBRE NU 35MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00
13,13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
13,14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	340,00
13,15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
13,16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	63,00
13,17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,00
13,18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 50X50X3000, COM TODOS OS COMPONENTES PARA FIXAÇÃO EM LAJE.	UND	100,00
13,19	TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 4 X 2 POL., 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	UND	103,00
13,20	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SECCAO PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	UND	24,00
13,21	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE TRES SECCOES PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	UND	1,00
13,22	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDIDA TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE BUCHAS PLASTICAS E PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS EM PAREDE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR.	UND	1,00
13,23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
13,24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00
13,25	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
14	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>		
14,1	<b>REDE FRIGORÍFICA</b>		

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 26 de 36

Marcelo Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

Andre Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE



SEINFRA FOLHA

825/A

14.1.1	TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 3/8" OU SIMILAR	M	12,00
14,2	<b>INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORÍFICA</b>		
14.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø3/8" OU SIMILAR	M	12,00
14.2.4	INSTALAÇÃO DE TUBO ARMAFLEX Ø 3/8" X 19MM OU SIMILAR	M	12,00
15	<b>RESERVATÓRIO DE 18.000,00 LITROS</b>		
15.1	ESCAVACAO E CARGA MECANICAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO , E AINDA TRANSPORTE COM D.M.T. 0,2 KM.	M³	22,95
15,2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M³	0,90
15.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1,08
15,4	LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO COM VAO NORMAL,INCLUSIVE CAPEAMNTO E ESCORAMENTO.	M²	9,00
15.5	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES-SURA.	M²	9,00
15,6	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M²	30,60
15,7	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3.	M²	30,60
15,8	IMPERMEABILIZACAO,EMPREGANDO ARGAMASSA DE CI- MENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:3 COM SIKA 1 -ESPESSURA DE 3 CM.	M²	39,60
15,9	FORNECIMENTO DE BOMBA 3/4 HP, INCLUSIVE ACESSORIOS, FIXACAO E INSTALACAO.	UNID.	1,00
15.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDA-VEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 32 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	9,00
16	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>		
16,1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	380,00

**UBS SANTA FILOMENA**

ITEM	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO
			Quantidades
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1,1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA. (MOD.AV-43/2000).	M2	6
1.2	BARRACAO PARA ESCRITORIO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA , COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1 6	M2	0
1,3	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1 6.	M2	0
1,4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHA- PAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM.	M2	222,6

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 27 de 36

Inácio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021

Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41  
Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBESEINFRA  
FOLHA

824/A

1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 63A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UND	0
1.6	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.	M2	500
1.7	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	328,41
1.8	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	0
1.9	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	0
1.10	EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO COM BARRO, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECÂNICO LEVE DE COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	155,95
2	<b>CONCRETO ARMADO</b>		
2.1	<b>FUNDAÇÃO( SAPATA E ARRANQUE DE PILARES)</b>		0
2.1.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	M2	19,18
2.1.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	6,23
2.1.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	534,54
2.1.4	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	86,8
2.2	<b>ESTRUTURA( BALDRAME, PILARES E VIGAS)</b>		0
2.1.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	35
2.1.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2488,36
2.1.4	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	520
2.3	<b>LAJE</b>		0
2.3.1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	312
3	<b>ALVENARIA</b>		
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	M2	213
3.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	84,4

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 28 de 36

Inácio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
CREA Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas





3,3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	38,4
3.4	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.	M2	650
4	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>		
4,1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3.	M2	1251
4,2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	1251
4.4	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	188,66
5	<b>REVESTIMENTOS DE PISO</b>		
5,1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8.	M2	312
5.2	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	M2	312
5.3	PISO CERAMICO ESMALTADO 45X45CM, TIPO A, PE I5 ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP. DA JUNTA=6MM).	M2	312
5.4	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	M2	220,75
5.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO Prensado (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A REIA 1 2	M	55
6	<b>PINTURA</b>		
6.1	PINTURA A BASE DE EMULSAO ACRILICA, CORALPLUS OU SIMILAR, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAOS E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA.	M2	438
6.2	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAOS DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA.	M2	624,34
6,3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETQ, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	328,41

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 29 de 36

Inácio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBESEINFRA  
FOLHA

822/A

6.4	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, DUAS DEMAOS, COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS.	M2	87,36
7	<b>ESQUADRIAS</b>		
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UND	24
7.2	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, TIPO CORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2	29
7.3	EA.02 - ESQUADRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, INCOLOR, COM 04 FOLHAS, SENDO 02 DE GIRO (1.10 X 2.10) E 02 FIXAS (1.10 X 2.10), E BANDEIRAS FIXAS. FERRAGENS ESPECÍFICAS, INCLUSIVE PUXADOR TIPO ALÇA EM AÇO INOX, TUBO RETANGULAR EM ALUMÍNIO 2"x4", CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL, FERRAGENS ESPECÍFICA E JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME DETALHE DE PROJETO.	UND	1
7.4	PORTÃO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO ( 3,20 x 2,10 )	UND	1
7.5	GRADES PARA JANELAS EM ESQUADRIA DE FERRO	M2	29
7.6	APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM VIDROS	M2	29
8	<b>COBERTA</b>		
8.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	312
8.2	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6 MM DE ESPESSURA, SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL.	M2	312
8.3	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	157,92
8.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	33,18
9	<b>FORRO</b>		
9.1	FORRO DE GESSO APLICADO EM LAJE PRE-MOLDADA.	M2	312
10	<b>DIVISÓRIAS E BANCADAS EM GRANITO</b>		
10.1	FORNECIMENTO DE BALCAO EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CORTE PARA UMA CUBA, TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M2	8,58
10.3	FORNECIMENTO DE RESPALDO DE 15CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M	25,2

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 30 de 36

Índio Marques Vieira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Matrícula Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas





10.4	FORNECIMENTO DE TESTEIRA DE 15CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M	28,8
<b>11</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
11.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	4
11.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIM PLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CE LITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	9
11.4	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UND	2
11.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL, MEKAL OU SIMILAR, NAS DIMENSOES 0.40 X 0,34 X 0,15 M, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	CJ	7
11.6	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE DE PLASTICO, DIAM. 1/2 POL. TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	UND	1
11.8	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. DE 1/2 POL., COM AREJADOR, REF.1158, LINHA C-33 SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	UND	7
11.9	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVA TORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL., REF.1193, LINHA C-33, SIGMA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	UND	12
11.10	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANO- PLA ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, DECA 50 OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UND	1
11.11	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39, DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UND	19
11.12	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1509-C39, DECA OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 1.1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UND	1
11.13	INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA DE PVC (CAPACIDADE DE 2000 LITROS), INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MESMA, COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES.	UND	1
11.14	INSTALACAO DE TORNEIRA DE BOIA DIAM.3/4 POL., INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	UND	1
11.15	BARRA PARA APOIO, 80 CM, LINHA CONFORTO, COR CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	UND	2
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENOS</b>		
<b>12.1</b>	<b>INSTALAÇÕES DE ESGOTO</b>		0

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 31 de 36

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021




Certidão nº 2220490440/2019

13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



SEINFRA  
FOLHA

820/A

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE

12.1.1	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	4
12.1.2	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	7
12.1.3	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	10
12.1.4	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	18
12.1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.50 MM, PARA VENTILACAO DE ESGOTO.	M	25
12.1.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	34
12.1.7	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDOEM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTER NAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M.	UND	12
12.1.8	CAIXA DE GORDURA COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50X 0,50 X 0,50 M COM CHICANA DE CONCRETO.	UND	1
12,2	<b>INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICAS</b>		0
12.2.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	29
12.2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 32 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	40
12.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	20
12,3	<b>DRENOS</b>		0
12.3.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA. PARA AR CONDICIONADO	M	25
12.3.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE	M	30

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 32 de 36

Victor Marques Vieira  
Município Municipal de Saúde  
Atividade Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



85

2



SEINF  
FULHA

819 X

SANTA CRUZ  
DO CAPIBARIBE

VALAS.			
13	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
13.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	73
13.2	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	24
13.3	PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	1
13.4	PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	2
13.5	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	96
13.7	FORNECIMENTO DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE EM- BUTIR COM ALETAS DE ALUMINIO ANODIZADO 2X32W, FEA 02 LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA, REA TOR ELETRONICO, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO	UND	31
13.8	FORNECIMENTO DE LUMINARIA ARANDELA DE ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA, AE 01 (P) 15W, LUMALUX OU SIM., INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 15W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO.	UND	34
13.9	FORNECIMENTO DE LUMINARIA REDONDA DE SOBREPOR DE ALUMINIO PINTADO E DIFUSOR DE VIDRO FOSCO COR BRANCA, PFD 03-2X20W, LUMALUX OU SIM., INCLUSIVE LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO	UND	8
13.10	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UND	4
13.11	ASSENTAMENTO DE CHAVE DE BOIA AUTOMATICA, 15A, SUPERIOR OU INFERIOR MARCA LENZ OU SIMILAR (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UND	1
13.12	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 33 de 36

Inácio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas





13,13	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15
13,15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	430
13,16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80
13,17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50
13,18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45
13,19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15
13,2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 50X50X3000, COM TODOS OS COMPONENTES PARA FIXAÇÃO EM LAJE.	UND	68,5
13.21	TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) C/PLACA P/ CAIXA DE 4 X 2 POL., 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND	96
13.22	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA SECCAO PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND	24
13.23	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE TRES SECCOES PARA CAIXA DE 4 X 2 POL., COM PLACA, 10A, 250V, PIAL (LINHA SILENTOQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND	27
13.24	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE BUCHAS PLASTICAS E PARAFUSOS PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM PAREDE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR.	UND	1
13,25	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2
13,26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	30
13.27	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1
14	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>		
14,1	<b>REDE FRIGORÍFICA</b>		0
14.1.1	TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø 3/8" OU SIMILAR	M	12
14,2	<b>INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORÍFICA</b>		0
14.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E TUBULAÇÃO DE COBRE ELUMA Ø3/8" OU SIMILAR	M	12

Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 34 de 36

Inácio Marques Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Carteira Nº 043/2013

André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41

Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



819/A



14.2.4	INSTALAÇÃO DE TUBO ARMAFLEX Ø 3/8" X 19MM OU SIMILAR	M	12
<b>15</b>	<b>RESERVATÓRIO DE 18.000,00 LITROS</b>		
15.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANICAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO, E AINDA TRANSPORTE COM D.M.T. 0,2 KM.	M³	22,95
15.2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M³	0,9
15.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1,08
15.4	LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO COM VAO NORMAL,INCLUSIVE CAPEAMNTO E ESCORAMENTO.	M²	9
15.5	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESURA.	M²	9
15.6	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M²	30,6
15.7	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3.	M²	30,6
15.8	IMPERMEABILIZACAO,EMPREGANDO ARGAMASSA DE CI- MENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:3 COM SIKA 1 -ESPESSURA DE 3 CM.	M²	39,6
15.9	FORNECIMENTO DE BOMBA 3/4 HP, INCLUSIVE ACESSORIOS, FIXACAO E INSTALACAO.	UNID.	1
15.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDA-VEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 32 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	m	10
<b>16</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>		
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021



*Marcelo Marques Medeiros*  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 042/2019

*Andre Luis Bezerra*  
Engenheiro Civil  
CREA 9960-D-PR

Marcelo Cesar Marques Medeiros  
Eng. Civil  
CREA: 13007-D

Página 35 de 36

Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41  
Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



*Handwritten signatures and marks in blue ink.*

816/A



*André Luis Bezerra*  
André Luis Bezerra  
Engenheiro Civil  
(Assinatura do fiscal de obra) CREA 9960-D-PR  
André Luis Bezerra  
Nº CREA: 9960 PB

*Marcelo César Marques Medeiros*  
(Assinatura do responsável técnico da empresa) Marcelo César Marques Medeiros  
Eng. Civil  
Nº CREA: 5488-7 CREA: 13007-D

*Inácio Marques Vieira*  
(Assinatura do Secretário Municipal de Saúde) Secretário Municipal de Saúde  
Portaria Nº 043/2018  
Inácio Marques Vieira  
CPF: 089.913.984-13

Santa Cruz do Capibaribe, 18 de Agosto de 2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220490440/2019, emitida em 10/12/2021




Certidão nº 2220490440/2019  
13/12/2021, 14:41  
Chave de Impressão: W5a18

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 36 folhas



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

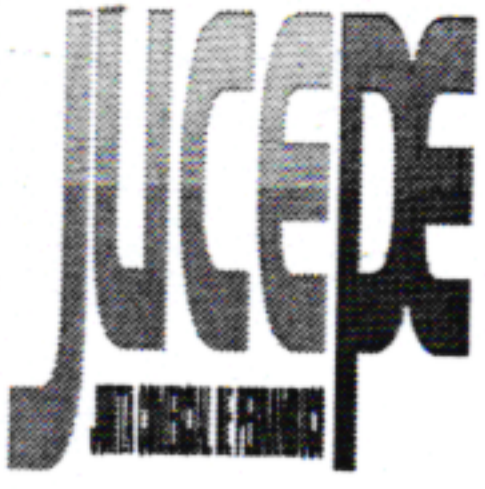

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202197257	17.633.457/0001-36	16/07/2014	21/02/2013
Endereço: AV AGAMENON MAGALHAES, 444 SALA: 302; ANDAR: 8; : EMPRESARIAL DIFUSORA;, MAURICIO DE NASSAU, CARUARU, PE - CEP: 55012290			

**OBJETO SOCIAL**

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE OBRAS DE ALVENARIA OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA PERFURAÇÕES E SONDAGENS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO

239882482

página: 1/3



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SEINFRA  
FOLHA  
814/A



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202197257	17.633.457/0001-36	16/07/2014	21/02/2013
Endereço: AV AGAMENON MAGALHAES, 444 SALA: 302; ANDAR: 8; : EMPRESARIAL DIFUSORA;, MAURICIO DE NASSAU, CARUARU, PE - CEP: 55012290			

LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA  
MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS  
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS  
OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE  
OBRAS DE ALVENARIA  
OBRAS DE FUNDAÇÕES  
OBRAS DE IRRIGAÇÃO  
OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS  
OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM  
PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA  
PERFURAÇÕES E SONDAGENS  
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS  
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO  
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA  
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERL  
TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS  Capital integralizado: 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

#### QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
MARCELO CESAR MARQUES MEDEIROS 039.774.304-16	570.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MARCELO CESAR MARQUES MEDEIROS 039.774.304-16	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ASTON MEDEIROS DOS SANTOS 041.456.744-72	30.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

239882482

página: 2/3



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial M&M EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26202197257	CNPJ 17.633.457/0001-36	Arquivamento do ato Constitutivo 16/07/2014	Início da atividade 21/02/2013
Endereço: AV AGAMENON MAGALHAES, 444 SALA: 302; ANDAR: 8; : EMPRESARIAL DIFUSORA;, MAURICIO DE NASSAU, CARUARU, PE - CEP: 55012290			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 06/2020	Número 20209154330	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			


RECIFE - PE, 25 de Janeiro de 2023

AMANDA AIRES VIEIRA Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

239882482

página: 3/3

CONTROLE: 5828056992166 CPF SOLICITANTE: 066.360.784-13 NIRE: 26202197257 EMITIDA: 25/01/2023 PROTOCOLO: 239882482

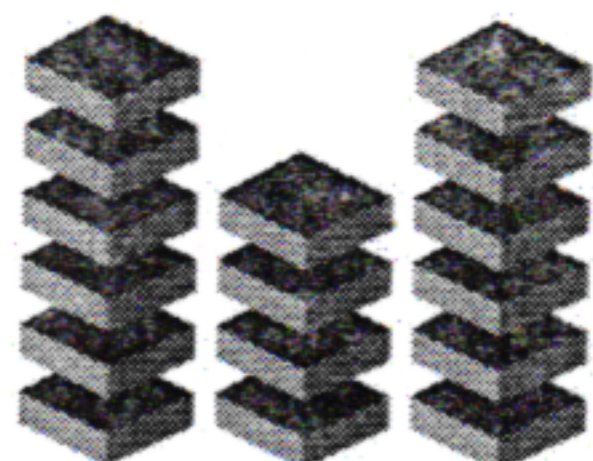

**M&M**  
EMPREENDIMIENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

M & M EMPREENDIMIENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA

C.N.P.J:17.633.457/0001-36

Av. Agamenon Magalhães;444-sala 302 andar 8°;

Empresarial difusora;Maurício de Nassau; Caruaru-PE;

CEP:55.012-290

SEI/PE  
FOLHA

812/A

## DECLARAÇÃO

**A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023**

A Empresa M & M Empreendimentos e Incorporação Ltda. Inscrita no CNPJ sob o n.º: 17.633.457/0001-36, por seu sócio administrador, DECLARA que possui aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da CONCORRÊNCIA, abaixo indicamos instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da CONCORRÊNCIA, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos:

Instalações:

Escritório - **Av. Agamenon Magalhães;444-sala 302 andar 8°; Empresarial difusora;Maurício de Nassau; Caruaru-PE; CEP:55.012-290.**

Equipamentos:

**2 betoneiras;**

**2 serras circular;**

**100 peças de andaimes;**

**2 poli corte;**

**2 furadeiras;**

**1 vibrador de concreto; e**

**1 martelete.**

Pessoal Técnico: **Marcelo César Marques Medeiros - CREA/PE 13007-D**


Caruaru, 25 de janeiro de 2023

*Marcelo César Marques Medeiros*  
**Marcelo Cesar Marques Medeiros**  
Engenheiro Civil  
CREA: 13007-D

"Construindo com qualidade e de forma sustentável"

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



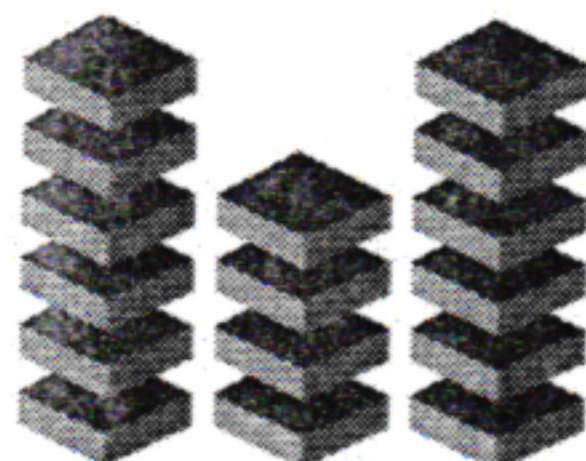

**M&M**  
EMPREENDIMENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA

C.N.P.J:17.633.457/0001-36

Av. Agamenon Magalhães;444-sala 302 andar 8°;  
Empresarial difusora;Maurício de Nassau; Caruaru-PE;

CEP:55.012-290

SEINFRA  
FOLHA

811/9

## DECLARAÇÃO

**A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023**

A Empresa M & M Empreendimentos e Incorporação Ltda. Inscrita no CNPJ sob o n.º: 17.633.457/0001-36, por seu sócio administrador, DECLARA que recebeu do órgão licitante, todos os documentos, e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da CONCORRÊNCIA.

Caruaru, 25 de janeiro de 2023


**Marcelo Cesar Marques Medeiros**  
Engenheiro Civil  
CREA: 13007-D

**M&M**

EMPREENDIMENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

*"Construindo com qualidade e de forma sustentável"*

Handwritten initials and numbers in blue ink: m/c, a circled 'D', and the number '94'.

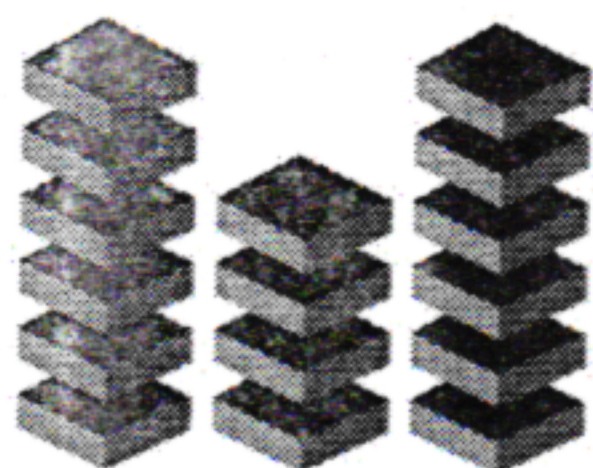

**M&M**  
EMPREENDIMIENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

**M & M EMPREENDIMIENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA**  
C.N.P.J:17.633.457/0001-36  
Av. Agamenon Magalhães;444-sala 302 andar 8°;  
Empresarial difusora;Maurício de Nassau; Caruaru-PE;  
CEP:55.012-290

## DECLARAÇÃO

SEINFRA  
FOLHA

810/1

**A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023**

A Empresa M & M Empreendimentos e Incorporação Ltda. Inscrita no CNPJ sob o n.º: 17.633.457/0001-36, por seu sócio administrador, DECLARA que concorda com todos os termos do edital e seus anexos.

Caruaru, 25 de janeiro de 2023


**Marcelo Cesar Marques Medeiros**  
Engenheiro Civil  
CREA: 13007-D

**M&M**

EMPREENDIMIENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

"Construindo com qualidade e de forma sustentável"

Handwritten initials and signatures in blue ink, including a large '95' and a signature that appears to be 'M&M'.

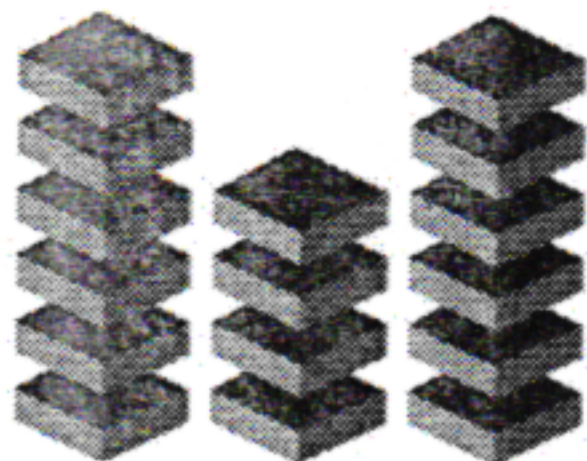

**M&M**  
EMPREENDIMENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA

C.N.P.J:17.633.457/0001-36

Av. Agamenon Magalhães;444-sala 302 andar 8º;  
Empresarial difusora;Maurício de Nassau; Caruaru-PE;

CEP:55.012-290

SEINFRA  
FOLHA

809 / A

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA  
CONDIÇÃO DE APRENDIZ**

**A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023**

A Empresa M & M Empreendimentos e Incorporação Ltda. Inscrita no CNPJ sob o n.º: 17.633.457/0001-36, por seu sócio administrador, **DECLARA**, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.


**Ressalva:** emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz


( ) (assinalar com "x" a ressalva acima, caso verdadeira)

Caruaru, 25 de janeiro de 2023

  
**Marcelo Cesar Marques Medeiros**  
Engenheiro Civil  
CREA: 13007-D

"Construindo com qualidade e de forma sustentável"



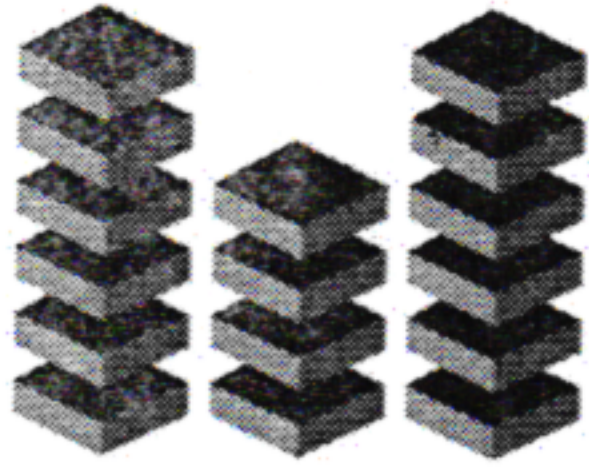

**M&M**  
EMPREENDIMIENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

M & M EMPREENDIMIENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA  
C.N.P.J:17.633.457/0001-36  
Av. Agamenon Magalhães;444-sala 302 andar 8º;  
Empresarial difusora;Maurício de Nassau; Caruaru-PE;  
CEP:55.012-290

SEINFRA  
FOLHA

808/A

## DECLARAÇÃO FATO IMPEDITIVO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

### TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023

A Empresa M & M Empreendimentos e Incorporação Ltda. Inscrita no CNPJ sob o n.º: 17.633.457/0001-36, por seu sócio administrador, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua contratação decorrente do processo licitatório em epígrafe, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Caruaru, 25 de janeiro de 2023


Marcelo Cesar Marques Medeiros  
Engenheiro Civil  
CREA: 13007-D

**M&M**

EMPREENDIMIENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

Handwritten initials and marks in blue ink, including 'r/c', a signature, and the number '97'.

"Construindo com qualidade e de forma sustentável"

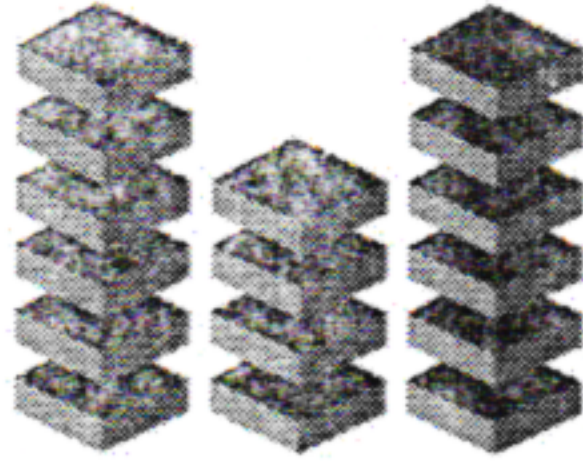

**M&M**  
EMPREENDIMENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA  
C.N.P.J:17.633.457/0001-36  
Av. Agamenon Magalhães;444-sala 302 andar 8°;  
Empresarial difusora;Maurício de Nassau; Caruaru-PE;  
CEP:55.012-290

SEINFRA  
FOLHA

805/A

## DECLARAÇÃO ART

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

### TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023

A Empresa M & M Empreendimentos e Incorporação Ltda. Inscrita no CNPJ sob o n.º: 17.633.457/0001-36, por seu sócio administrador, declara sob as penas da lei, que apresentaremos no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato a ART quitada referente à execução dos serviços.

Caruaru, 25 de janeiro de 2023

Marcelo Cesar Marques Medeiros  
Engenheiro Civil  
CREA: 13007-D

**M&M**

EMPREENDIMENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

Handwritten initials and signatures in blue ink, including 'r/c', a large signature, and '98'.

"Construindo com qualidade e de forma sustentável"



M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA  
C.N.P.J:17.633.457/0001-36  
Av. Agamenon Magalhães;444-sala 302 andar 8°;  
Empresarial difusora;Maurício de Nassau; Caruaru-PE;  
CEP:55.012-290

SEINFRA  
FOLHA

806/A

## DECLARAÇÃO CONCORRÊNCIA DE VISITA TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023

A Empresa M & M Empreendimentos e Incorporação Ltda. Inscrita no CNPJ sob o n.º: 17.633.457/0001-36, por seu sócio administrador DECLARA sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com Município de SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, isentando-o de qualquer reclamação ou reivindicação.

Caruaru, 25 de janeiro de 2023


*Marcelo Cesar Marques Medeiros*

Marcelo Cesar Marques Medeiros  
Engenheiro Civil  
CREA: 13007-D

M&M  
EMPREENDIMENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

"Construindo com qualidade e de forma sustentável"

*[Handwritten signatures and initials]*

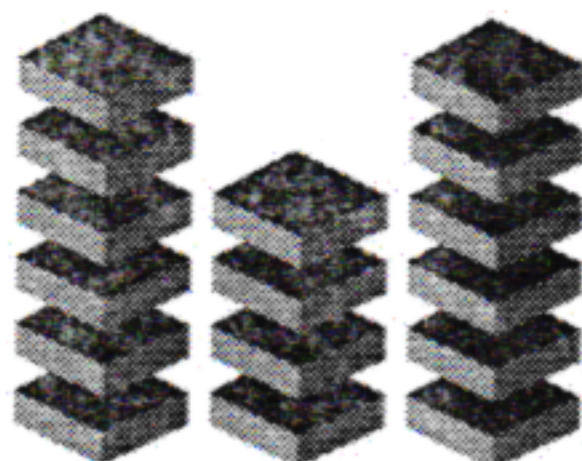

**M&M**  
EMPREENDIMENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA

C.N.P.J:17.633.457/0001-36

Av. Agamenon Magalhães;444-sala 302 andar 8°;  
Empresarial difusora;Maurício de Nassau; Caruaru-PE;

CEP:55.012-290

SEINTRA  
FOLHA

805/A

## DECLARAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE ACERVO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023

A Empresa M & M Empreendimentos e Incorporação Ltda. Inscrita no CNPJ sob o n.º: 17.633.457/0001-36, por seu sócio administrador DECLARA e por seu engenheiro componente do quadro técnicos, sob as penalidades da lei, que autoriza a apresentação dos acervos para comprovação da capacidade técnico-profissional exigida na **TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023** e que integra o quadro técnico da empresa participante do certame realizado pelo município de SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

Caruaru, 25 de janeiro de 2023


**Marcelo César Marques Medeiros - CREA/PE 13007-D**

Marcelo Cesar Marques Medeiros

Engenheiro Civil  
CREA: 13007-D

EMPREENDIMENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

"Construindo com qualidade e de forma sustentável"

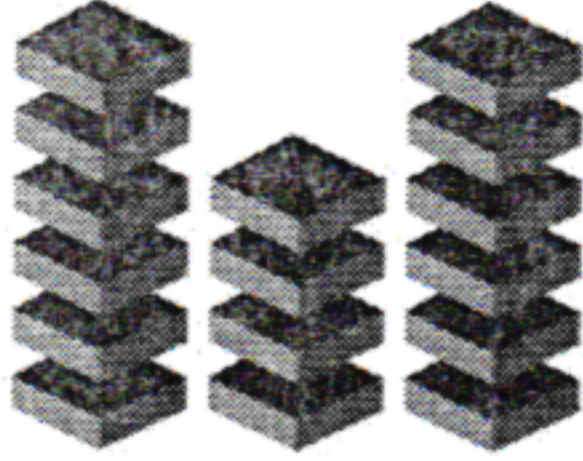

**M&M**  
EMPREENDIMIENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

**M & M EMPREENDIMIENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA**  
C.N.P.J:17.633.457/0001-36  
Av. Agamenon Magalhães;444-sala 302 andar 8°;  
Empresarial difusora;Maurício de Nassau; Caruaru-PE;  
CEP:55.012-290

SEINERA  
FOLHA

804/A

## DECLARAÇÃO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023**

A Empresa M & M Empreendimentos e Incorporação Ltda. Inscrita no CNPJ sob o n.º: 17.633.457/0001-36, por seu sócio administrador DECLARA sob as penas da lei, que somos Empresa de Pequeno Porte, e que não estamos incursos das vedações a que se reporta o §4 do art. 3º da Lei Complementar 123/06.

Caruaru, 25 de janeiro de 2023


**Marcelo Cesar Marques Medeiros**  
Engenheiro Civil  
CREA: 13907-D

**M&M**

EMPREENDIMIENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

"Construindo com qualidade e de forma sustentável"



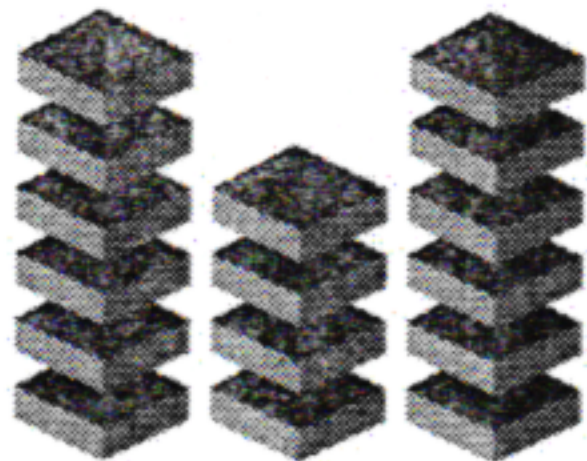

**M&M**  
EMPREENDIMENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA

C.N.P.J:17.633.457/0001-36

Av. Agamenon Magalhães;444-sala 302 andar 8º;  
Empresarial difusora;Maurício de Nassau; Caruaru-PE;

CEP:55.012-290

SEI N.º  
FULHA  
803/A

## DECLARAÇÃO DE VÍNCULO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023

A Empresa M & M Empreendimentos e Incorporação Ltda. inscrita no CNPJ sob o n.º: 17.633.457/0001-36, por seu sócio administrador DECLARA sob as penalidades da lei, não possui nenhum tipo de vínculo com a administração pública municipal, nem tampouco com quaisquer membro da Comissão Permanente de Licitações do Fundo Municipal de Saúde e/ou Prefeitura.

Caruaru, 25 de janeiro de 2023

Marcelo Cesar Marques Medeiros


Engenheiro Civil  
CREA: 13007-D

**M&M**

EMPREENDIMENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

Handwritten initials and marks: r/c, a signature, and the number 102.

"Construindo com qualidade e de forma sustentável"

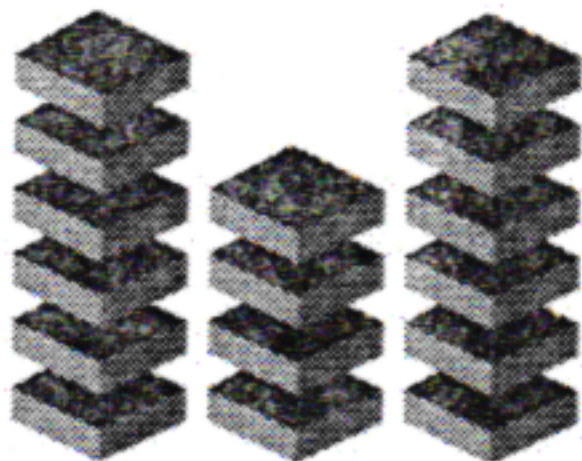

**M&M**  
EMPREENDIMENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA

C.N.P.J:17.633.457/0001-36

Av. Agamenon Magalhães;444-sala 302 andar 8°;  
Empresarial difusora;Maurício de Nassau; Caruaru-PE;

CEP:55.012-290

SEINFRA  
FOLHA

802/A

## DECLARAÇÃO NEGATIVA DE IDONEIDADE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023

A Empresa M & M Empreendimentos e Incorporação Ltda. inscrita no CNPJ sob o n.º: 17.633.457/0001-36, por seu sócio administrador DECLARA não está cumprindo pena de "INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, conforme determina o art. 97 da Lei nº 8.666/93.


Marcelo Cesar Marques Medeiros  
Engenheiro Civil  
CREA: 13007-D

Caruaru, 25 de janeiro de 2023

**M&M**

EMPREENDIMENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

"Construindo com qualidade e de forma sustentável"

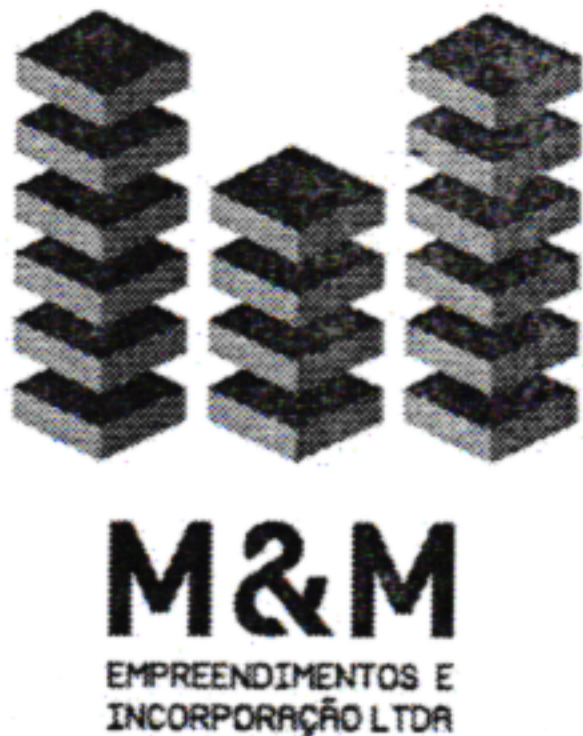

M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA  
C.N.P.J:17.633.457/0001-36  
Av. Agamenon Magalhães;444-sala 302 andar 8°;  
Empresarial difusora;Maurício de Nassau; Caruaru-PE;  
CEP:55.012-290

SEINFRA  
FOLHA

501/A

## DECLARAÇÃO COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023

A Empresa M & M Empreendimentos e Incorporação Ltda. Inscrita no CNPJ sob o n.º: 17.633.457/0001-36, por seu sócio administrador DECLARA possui as suas instalações comerciais funcionando no endereço epigrafado e está apta a prestar os serviços objeto da **TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023**.

Caruaru, 25 de janeiro de 2023

Marcelo Cesar Marques Medeiros  
Engenheiro Civil  
CREA: 13007-D

M&M  
EMPREENDIMENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

"Construindo com qualidade e de forma sustentável"



M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA

C.N.P.J:17.633.457/0001-36

Av. Agamenon Magalhães;444-sala 302 andar 8°;  
Empresarial difusora;Maurício de Nassau; Caruaru-PE;

CEP:55.012-290

SEINFRA  
FOLHA

800/A

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

### A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

#### TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023


A Empresa M & M Empreendimentos e Incorporação Ltda. inscrita no CNPJ sob o n.º: 17.633.457/0001-36, por seu sócio administrador para fins do disposto no Edital da **TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023** foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023 quanto a participar ou não da referida Concorrência;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023 antes da adjudicação do objeto da referida Concorrência.

*"Construindo com qualidade e de forma sustentável"*

*mp*  
**Marcelo Cesar Marques Medeiros**  
Engenheiro Civil  
CREA: 13007-D

105

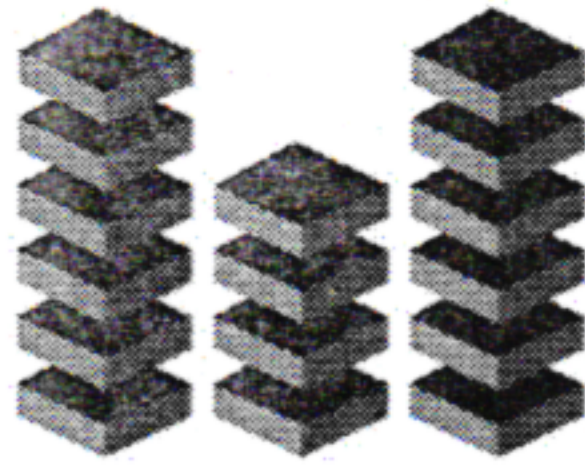

**M&M**  
EMPREENDIMIENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

M & M EMPREENDIMIENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA

C.N.P.J:17.633.457/0001-36

Av. Agamenon Magalhães;444-sala 302 andar 8°;  
Empresarial difusora;Maurício de Nassau; Caruaru-PE;

CEP:55.012-290

SEI-M-11  
FOLHA

299/A

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura de SÃO LOURENÇO DA MATA/PE antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

*Marcelo Cesar Marques Medeiros*

Caruaru, 25 de janeiro de 2023


Marcelo Cesar Marques Medeiros  
Engenheiro Civil  
CREA: 13007-D

**M&M**

EMPREENDIMIENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

*2/c* *106*  
*mx*

"Construindo com qualidade e de forma sustentável"

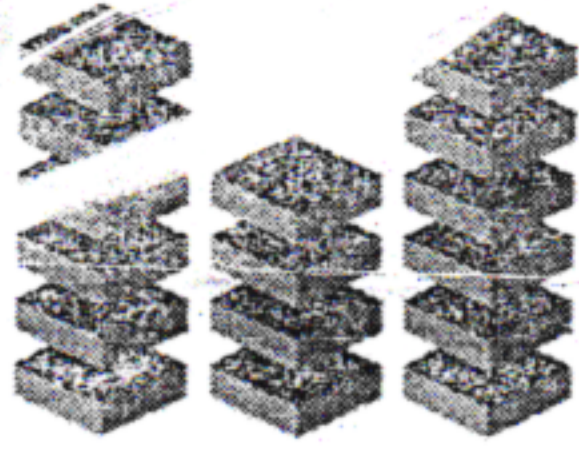

**M&M**  
EMPREENDIMENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

**M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA**

C.N.P.J:17.633.457/0001-36

Av. Agamenon Magalhães;444-sala 302 andar 8º;  
Empresarial difusora;Maurício de Nassau; Caruaru-PE;  
CEP:55.012-290

SEINFRA  
FOLHA

298/A

**M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA**  
C.N.P.J:17.633.457/0001-36

**A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023**

**26/01/2023 às 10:00h**

**ENVELOPE - 1 HABILITAÇÃO**

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para  
Construção de Unidade Básica de Saúde – UBS, Ponto de Apoio para atendimento, no  
bairro de Tiúma II – CNES 7167229, no município de São Lourenço da Mata/PE.  
(proposta nº 12257.7650001/21-003 – Ministério da Saúde).

**M&M**  
EMPREENDIMENTOS E  
INCORPORAÇÃO LTDA

*"Construindo com qualidade e de forma sustentável"*
